


Plataforma Colaborativa Microsoft SharePoint – Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

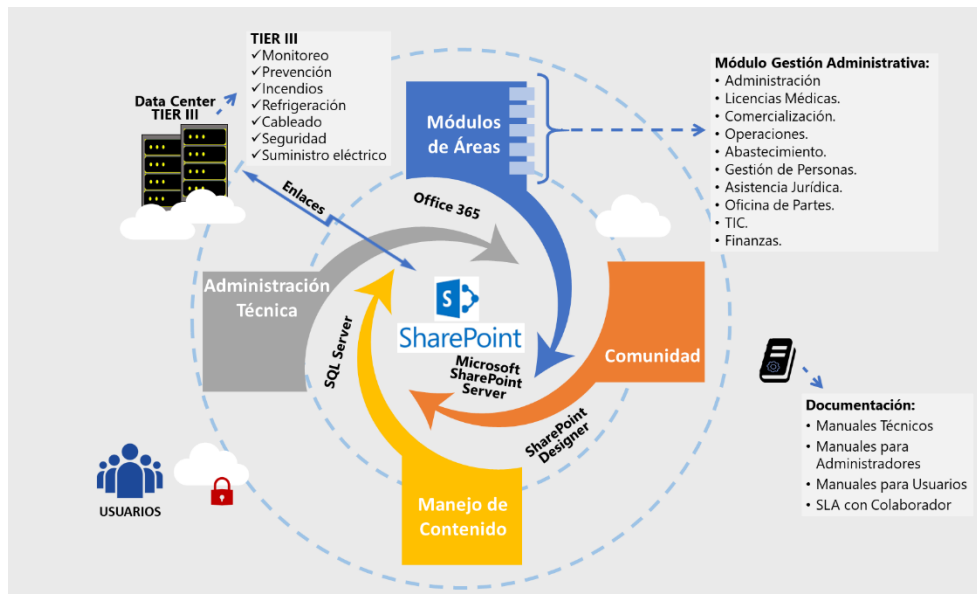

Informe sobre taller 1 y 2 Acta de constitución, WBS y SBS

Equipo 7

Integrantes:

Iván Yuzet Delgado Gamarra.
Carlos Eduardo Fuentealba Saavedra.
Miguel Ángel Liapiz Lefio.
Keila Geovanna Machado González.
Pedro Antonio Peña Espinoza.

Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2020

INDICE

Portada.	Página 1.
Índice.	Página 2.
Introducción.	Página 3.
Acta de Constitución.	Página 4.
Estructura de descomposición del trabajo – EDT (WBS).	Página 8.
Estructura de descomposición del sistema (SBS).	Página 9.
Conclusión.	Página 10.
Anexos – Mapas Mentales:	
Carlos Eduardo Fuentealba Saavedra.	Página 12.
Miguel Ángel Liapiz Lefio.	Página 13.
Keila Geovanna Machado González.	Página 14.
Pedro Antonio Peña Espinoza.	Página 15.

Introducción.

Sr. Lector, como parte del Diplomado de Administración y Dirección de Proyectos, hemos diseñado un proyecto que está enfocado en la implementación de una herramienta colaborativa en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río ubicado en la Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto, Santiago, y el cual tiene como Sponsor en rol de Mandante al Subdirector de Administración y como Líder técnico al Subdirector de TI , acompañado por dos referentes técnicos y por un equipo que realizará las actividades de administración del proyecto, y que será el responsable de interactuar con todas las unidades del complejo asistencial.



El proyecto fue aprobado para su ejecución, como parte del objetivo estratégico del Complejo Asistencial que está asociado a la transformación y mejora continua de los procesos internos, que tiene como finalidad mejorar la calidad de los servicios y la comunicación corporativa dentro del establecimiento.

El proyecto cuenta con el certificado de ejecución presupuestaria por \$400.000.000 de pesos y se estima su implementación en 12 meses. El proyecto busca centralizar la información, crear espacios sociales y optimizar los procesos administrativos (en primera instancia enfocado a los procesos de abastecimiento).



Para ello, se elaboró un plan de ejecución del proyecto de alto nivel que contempla 6 hitos principales: 1) Administración del proyecto; 2) Proceso de Licitación; 3) Análisis y diseño; 4) Implementación de plataforma y gestión de pruebas; 5) Difusión y capacitación y 6) Proceso de Operación Controlada. Se ha definido una estrategia de comunicación permanente que incluye como puntos relevantes, la elaboración de informes de seguimiento semanal y quincenal. Este último tiene carácter de Gobernanza en donde se evaluará la ejecución técnica y financiera del proyecto, revisión de los hallazgos y riesgos, y la aprobación de controles de cambio.

Con base en lo descrito en los párrafos anteriores y como parte de las actividades del Diplomado, a continuación, desarrollamos: a) el Acta de Constitución del Proyecto, b) la estructura de descomposición del trabajo – EDT (WBS por sus siglas en inglés) y c) la estructura de descomposición del sistema entregable (SBS), como parte de las herramientas de gestión. Adicionalmente, hemos incorporado como anexos los mapas mentales individuales de tema libre, solicitados como parte de este informe, elaborados por cada uno de los integrantes de este equipo. Por lo anterior, le invitamos a continuar con la lectura y revisión de este documento.

Acta de Constitución del Proyecto

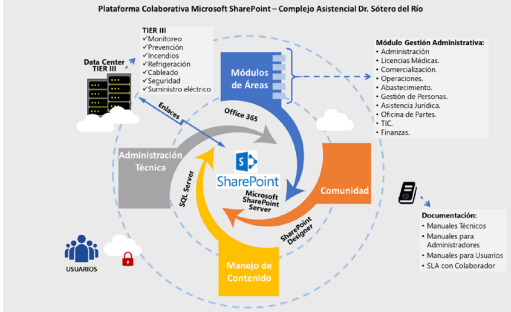
Nombre del Proyecto: Plataforma Colaborativa Microsoft SharePoint para el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río			
Preparado por: EQUIPO 7 DAP 64		Fecha: 09-11-2020	
Patrocinador (Sponsor) del Proyecto:	Sub Director Administrativo	Gerente del Proyecto	Sub Director de TIC
1. Descripción del Proyecto:	El Complejo Asistencial actualmente tiene dos grandes necesidades, por un lado, organizar de forma centralizada toda la documentación e información disponible de cada uno de sus departamentos y por otro lado, potenciar el sistema de gestión administrativa, centralizando vínculos hacia aplicativos internos y externos para facilitar y socializar el acceso, minimizando el desconocimiento de los procesos y protocolos administrativos. Actualmente posee islas de información que ralentiza la eficiencia del proceso. Objetivo general Implementar una plataforma colaborativa Microsoft SharePoint en el Complejo Asistencial Doctor Sotero del Río para organizar de forma centralizada toda la documentación e información de todos sus departamentos y manejar un sistema de gestión administrativo más robusto, en primera instancia, para los procesos administrativos. El proyecto se estipula implementar en el plazo de 12 meses con un presupuesto de \$400.000.000 de pesos anuales. Objetivos específicos • Levantar y definir flujos de trabajo para las distintas áreas del Complejo Asistencial que permita controlar y resguardar la información. • Identificar los requerimientos o necesidades de comunicación y documentación en general. • Identificar los requerimientos técnicos y de redes de comunicación para implementar la solución. • Capacitar al personal del Complejo Asistencial en el manejo de la nueva plataforma. • Integrar el sistema actual de gestión administrativa con la nueva plataforma para mejorar la eficiencia del proceso de abastecimiento. • Facilitar el uso ofimático con la nueva plataforma.	 	
2. Propósito/Necesidad del Negocio:	El proyecto tiene el propósito de: • Optimizar la gestión documental mediante biblioteca de documentos. • Centralizar información y documentación. • Optimizar tiempos de respuestas en búsqueda de información. • Compartir información, documentos, calendarios, tareas y otros elementos importantes para todo el establecimiento. • Optimizar la eficiencia de la gestión administrativa. • Crear sitios web (espacios virtuales) para organizar actividades, calendarios, tareas. • Intercambio de información de documentación. Los clientes, en una primera etapa de implementación, serán: • Clientes internos (Finanzas, Operaciones, Abastecimiento, Gestión de las Personas, Asistencia Jurídica, Oficina de Partes, TIC, Tesorería, Comercialización, Licencias Médicas) • Clientes externos (Colaboradores).		
3. Localización:	El proyecto se llevará a cabo en las dependencias del Complejo Asistencial, ubicado en Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto, Santiago. El personal Colaborador (proveedor) ejecutará sus labores en un container adaptado con todas las necesidades requeridas para cumplir con sus funciones.		
4. Posición desde la que se abordará:	El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, a través del Sub Director de Administración será el mandante de este proyecto.		
5. Etapa del ciclo de vida del proyecto que se abordará:	En el proyecto se abordará desde las etapas de inicio y planificación, ejecución y control y cierre. 		


6. Descripción del alcance físico del proyecto:	El proyecto consiste en la implementación de la plataforma colaborativa Microsoft SharePoint, para lo cual se requiere cumplir con el siguiente alcance por parte del colaborador: • Proporcionar la infraestructura del Hardware y Software. • Desarrollar los módulos para centralización de la documentación para todos los departamentos del Complejo Asistencial (módulos de: Finanzas, Operaciones, Abastecimiento, Gestión de las Personas, Asistencia Jurídica, Oficina de Partes, TIC, Tesorería, Comercialización, Licencias Médicas). • Documentar manuales técnicos, administradores, usuarios y revisión de SLA con Colaborador (mejora continua).	Exclusiones: El proveedor no desarrollará módulos adicionales del negocio, sin embargo, se capacitará un key user (TIC) para un desarrollo futuros de otros módulos no mencionados en el proyecto. Se excluye el dominio exclusivo del código fuente por parte del colaborador post implementación, es decir, el código fuente pertenece al Complejo Asistencial una vez se implemente la solución.
7. Descripción del alcance de los servicios actividades que realizará el proyecto:	1. Plataforma Colaborativa Microsoft SharePoint para el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 1.1 Administración del Proyecto: 1.1.1. Inicio y planificación. 1.1.1.1. Elaborar acta de constitución, lista de entregables y EDT del proyecto. 1.1.1.2. Elaborar plan del proyecto y plan de gestión del cambio. 1.1.1.3. Gestionar grupo de interés (Kick Off – Reuniones). 1.1.2. Ejecución y Control: 1.1.2.1. Actualizar plan del proyecto y Gestionar y ejecutar los cambios aprobados (Gestión del cambio) 1.1.2.2. Elaborar informes de avances y control del proyecto. 1.1.3. Cierre: 1.1.3.1. Gestionar cierre de contrato, cierre técnico, administrativo y legal. 1.1.3.2. Gestionar reunión de cierre y revisión de lecciones aprendidas. 1.2 Proceso de Licitación y Administración del contrato: 1.2.1. Conformación de la comisión evaluadora (administrativa, funcional y técnica). 1.2.1.1. Elaborar y publicar términos de referencia. 1.2.1.2. Ejecutar licitación. 1.2.2. Ejecución del proceso de adjudicación. 1.2.2.1. Elaborar acta de evaluación y publicar resolución de adjudicación. 1.2.2.2. Elaborar, suscribir y administrar el contrato. 1.3 Análisis y diseño: 1.3.1. Levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales: 1.3.1.1. Diseñar template de los módulos y de la página principal. 1.3.1.2. Evaluar integraciones e identificar flujos de información y documentación. 1.3.2. Evaluación de riesgos y resolución de conflictos: 1.3.2.1. Presentar el plan de riesgo al Colaborador y evaluar cumplimiento. 1.3.2.2. Validar requisitos para resolver inconsistencia y/o conflictos funcionales y técnicos. 1.3.3. Levantamiento de riesgos y control de acceso: 1.3.3.1. Presentar el sistema de seguridad de la información y Definir perfiles de acceso. 1.3.3.2. Identificar y gestionar los riesgos. 1.4 Implementación de plataforma y gestión de pruebas: 1.4.1. Plan de pruebas 1.4.1.1. Generar y validar plan de prueba con los referentes técnicos. 1.4.1.2. Ejecutar plan de pruebas (ambiente QA). 1.4.2. Paso a producción. 1.4.2.1. Generar acta de paso a producción. 1.4.2.2. Generar visto bueno técnico y funcional. 1.5 Difusión y capacitación: 1.5.1. Estrategia comunicacional: 1.5.1.1. Elaborar y ejecutar plan de estrategia comunicacional. 1.5.1.2. Evaluar la efectividad de la estrategia comunicacional. 1.5.2. Capacitación: 1.5.2.1. Elaborar y ejecutar plan de capacitación. 1.5.2.2. Ejecutar capacitación técnica y de usuario (administrador/estándar). 1.5.2.3. Evaluar y cerrar capacitaciones. 1.6 Proceso de operación controlada: 1.6.1. Marcha blanca. 1.6.1.1. Validar la efectividad del sistema y ejecutar pruebas no realizadas en etapa previa. 1.6.1.2. Proporcionar apoyo para resolver hallazgos y cerrar marcha blanca. 1.6.2. Go Live.	Exclusiones:

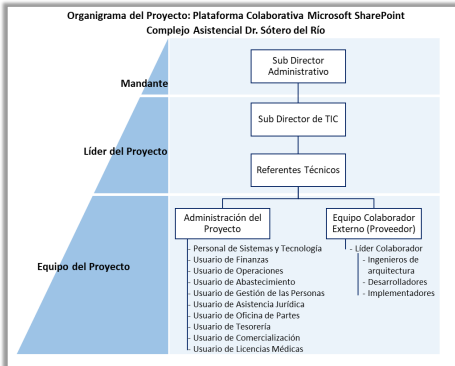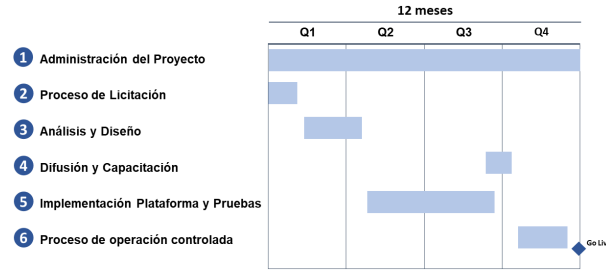	1.6.2.1. Iniciar, monitorear y controlar Go Live. 1.6.2.2. Generar “Visto Bueno” técnico y funcional de aceptación del sistema.																										
8. Administración del Proyecto:	Organigrama: • Mandante y Líder del Proyecto. • Personal de TIC. • Usuarios de las unidades de: Finanzas, Operaciones, Abastecimiento, Gestión de las Personas, Asistencia Jurídica, Oficina de Partes, Tesorería, Comercialización, Licencias Médicas. • Referentes técnicos. • Equipo colaborador externo. Programa general de hitos: 1) Administración del Proyecto: 12 meses. 2) Proceso de Licitación: 1 mes. 3) Análisis y diseño: 2 meses. 4) Implementación plataforma y pruebas: 7 meses. 5) Difusión y capacitación: 3 semanas. 6) Proceso de operación controlada: 1 mes, 2 semanas. Partes de interesadas: • Mandante: Sub Director Adminsitrativo. • Líder del proyecto: TIC Complejo Asistencial. • Usuarios internos: Finanzas, Operaciones, Abastecimiento, Gestión de las Personas, Asistencia Jurídica, Oficina de Partes, Tesorería, Comercialización, Licencias Médicas. • Proveedor (colaborador). • Usuarios externos (clínicos y apoyo). Herramientas de Gestión: • Microsoft Project (cronograma). • Reportabilidad (avances, hitos). • Microsoft Excel. Metodología: 7) PMI – PMBOOK.	Organigrama del Proyecto: Plataforma Colaborativa Microsoft SharePoint Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río  Organigrama del Proyecto: Plataforma Colaborativa Microsoft SharePoint Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 12 meses 																									
9. Supuestos, Restricciones, Riesgos:	Supuesto: • Problema factibilidad técnica. • No se logra interoperabilidad con aplicativo de gestión de abastecimiento. • Resistencia al cambio en los clientes. • Problemas con enlace interno y externo (comunicaciones). • No cumplir con los plazos de entrega de 12 meses. Restricciones: • Sistema de Seguridad de la Información. • Ley 20.584 de los deberes y derechos de los pacientes. • Confidencialidad de los datos. Riesgos: • Mal análisis de capacidad técnica del procesamiento hardware (Capacity). • Red de comunicación. • Mal dimensionamiento de licencias por usuario.																										
10. Recursos:	• El equipo de recursos humanos está compuesto por un mandante (Sub director administrativo), un líder de proyecto (subdirector TIC), dos referentes técnicos, un equipo de administración de proyecto compuesto por cuatro personas y también participa una persona de cada área (módulos o subdirección) del Complejo Asistencial y un equipo colaborador externo por parte del proveedor. • El personal Colaborador (proveedor) ejecutará sus labores en un container adaptado con todas las necesidades requeridas para cumplir con sus funciones. • Forman parte del proyecto 2 profesionales del Complejo Asistencial con competencias técnicas para la supervisión, monitoreo y control de la implementación de la plataforma (referentes técnicos). • El personal TIC del Complejo Asistencial, como líder del proyecto, ha dispuesto de un grupo de 4 personas (2 TIC más 2 profesionales funcionales) a dedicación exclusiva para ejercer las funciones de administración del proyecto. El resto del personal de TIC estará trabajando a demanda durante la implementación y la puesta en marcha. El personal de TIC en general estará en sus puestos de	<table><tr><th>Ítem</th><th>Valor licencia</th><th>Cantidad usuarios</th><th>Valor licencia Mensual</th><th>Total inversión</th></tr><tr><td>Cuentas premium</td><td>\$ 15.000</td><td>1.000</td><td>\$ 15.000.000</td><td>\$180.000.000</td></tr><tr><td>Cuentas básicas</td><td>\$ 5.000</td><td>1.000</td><td>\$ 5.000.000</td><td>\$60.000.000</td></tr><tr><td>Infraestructura e implementación</td><td></td><td></td><td></td><td>\$160.000.000</td></tr><tr><td>Total anual</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 400.000.000</td></tr></table>	Ítem	Valor licencia	Cantidad usuarios	Valor licencia Mensual	Total inversión	Cuentas premium	\$ 15.000	1.000	\$ 15.000.000	\$180.000.000	Cuentas básicas	\$ 5.000	1.000	\$ 5.000.000	\$60.000.000	Infraestructura e implementación				\$160.000.000	Total anual				\$ 400.000.000
Ítem	Valor licencia	Cantidad usuarios	Valor licencia Mensual	Total inversión																							
Cuentas premium	\$ 15.000	1.000	\$ 15.000.000	\$180.000.000																							
Cuentas básicas	\$ 5.000	1.000	\$ 5.000.000	\$60.000.000																							
Infraestructura e implementación				\$160.000.000																							
Total anual				\$ 400.000.000																							

	trabajo habituales. • Los usuarios del resto de las unidades del Complejo Asistencial estarán participando a demanda a medida que sean requeridos para reuniones, levantamiento de información y/o ejecución de pruebas de la plataforma. • A nivel Financiero el proyecto cuenta con el certificado de ejecución presupuestaria producto del proceso de licitación.	
11. Estrategia:	Gobernanza • El proyecto incluirá a personal capacitado y con experiencia en implementación y operación del sistema para validar avances y cumplimientos, de acuerdo a necesidades funcionales y técnicas: referentes técnicos, que den soporte al líder del proyecto y al equipo. • Se realizarán reuniones quincenales para verificar el estado de avance y estado del presupuesto del proyecto, entre el Director, el mandante, el líder del proyecto y el resto de la directiva del Complejo Asistencial. Comunicación • Con respecto a los stakeholders internos, en el kick off, se realizará una presentación del proyecto a las autoridades del Complejo Asistencial y a los funcionarios y trabajadores de las áreas de administración y operaciones involucrados. • Se realizarán reuniones internas semanales para verificar el estado de avance del proyecto, entre el líder del proyecto, el colaborador y los representantes del equipo del proyecto. • Se realizarán presentaciones audiovisuales para motivar el uso de la plataforma. Implementación: • La implementación es gradual: inicialmente se involucrará a 2,000 usuarios de 3,500 trabajadores. 1,000 trabajadores con licencia para empresa "básica" y 1,000 con licencia "premium". • Ello permite acotar el presupuesto necesario para el proyecto. Gestión del cambio + sprint: • Socializar a todo el personal en reuniones de cierre y de inicio de sprint. • Capacitación para los usuarios. Monitoreo del uso de la plataforma por parte de los usuarios. • Implementación de una mesa de ayuda para dar asistencia a los usuarios en el uso de las herramientas de la plataforma.	
12. Comunicación y Reportes:	El plan de comunicaciones del proyecto incluye: • La elaboración semanal de informes de avance y control del proyecto (para seguimiento en general con todo el equipo de trabajo). • La elaboración de avances a nivel directivo (información relevante para ese nivel en donde se incluye datos sobre la ejecución financiera del proyecto). • Minuta de reuniones semanales (con todo el equipo) y quincenales (Gobernanza). • Informes técnicos y control de bitácora de incidencias.	
13. Criterios de Aceptación:	El Mandante ha solicitado al líder del proyecto el envío de los siguientes formatos, como criterios de aceptación: • Formulario de "Visto Bueno" de cada área. • Formulario de "Visto Bueno" del responsable técnico. • Informe final del proyecto.	
14. Administración del Cambio:	El procedimiento para la gestión del cambio incluye: • El llenado del formulario de "Control de Cambios TIC", en donde el líder técnico debe especificar los cambios. • Evaluar el impacto en el presupuesto de los cambios aprobados. • La ejecución de un Comité del Cambio que evaluará y aprobará o rechazará, el cambio planteado en el formulario. En este comité participa: El Mandante (Sub Director Administrativo, el líder del Proyecto (TIC), referentes técnicos y el área usuaria que solicitó el cambio (si aplica).	
15. Otras materias de interés:	• Se define que el colaborador aplique lo indicado en la política de seguridad de la información del Complejo Asistencial y la política de confidencialidad de datos del Ministerio de Salud (MINSAL), además, deberá mantener reserva de la información que accederá. • El colaborador deberá aplicar un buen uso del mobiliario y hardware facilitado por el Complejo Asistencial. • El colaborador deberá cumplir con las normas internas del Complejo Asistencial, llámese, normas de buena conducta, horarios y reglamento interno. • El colaborador deberá proveer a su personal de los elementos de protección personal (EPP) para protección de las personas.	
Aprobación:	Nombre y firma Gte. del Proyecto:	Nombre y forma Patrocinador:

WBS_Plataforma Colaborativa Microsoft SharePoint_Equipo 7

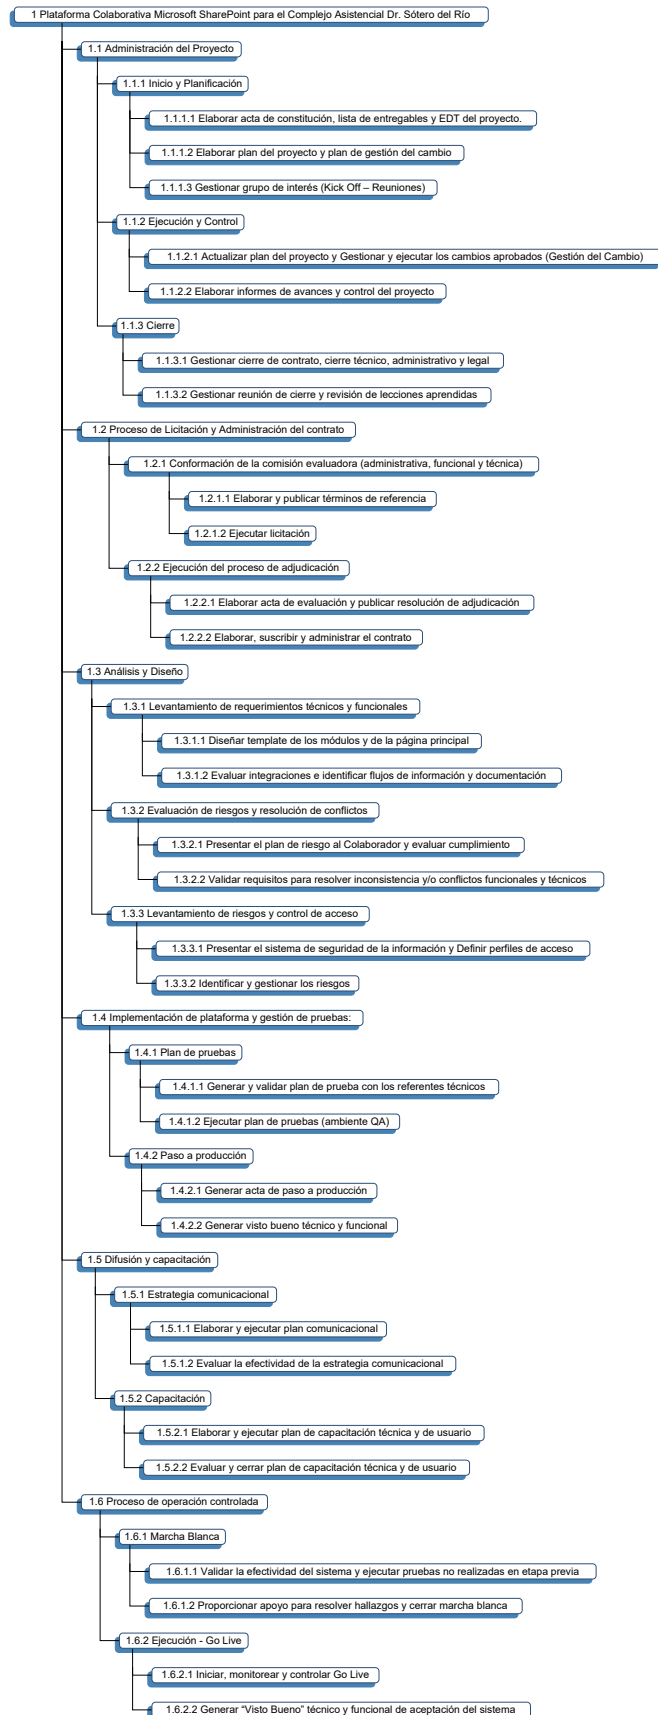

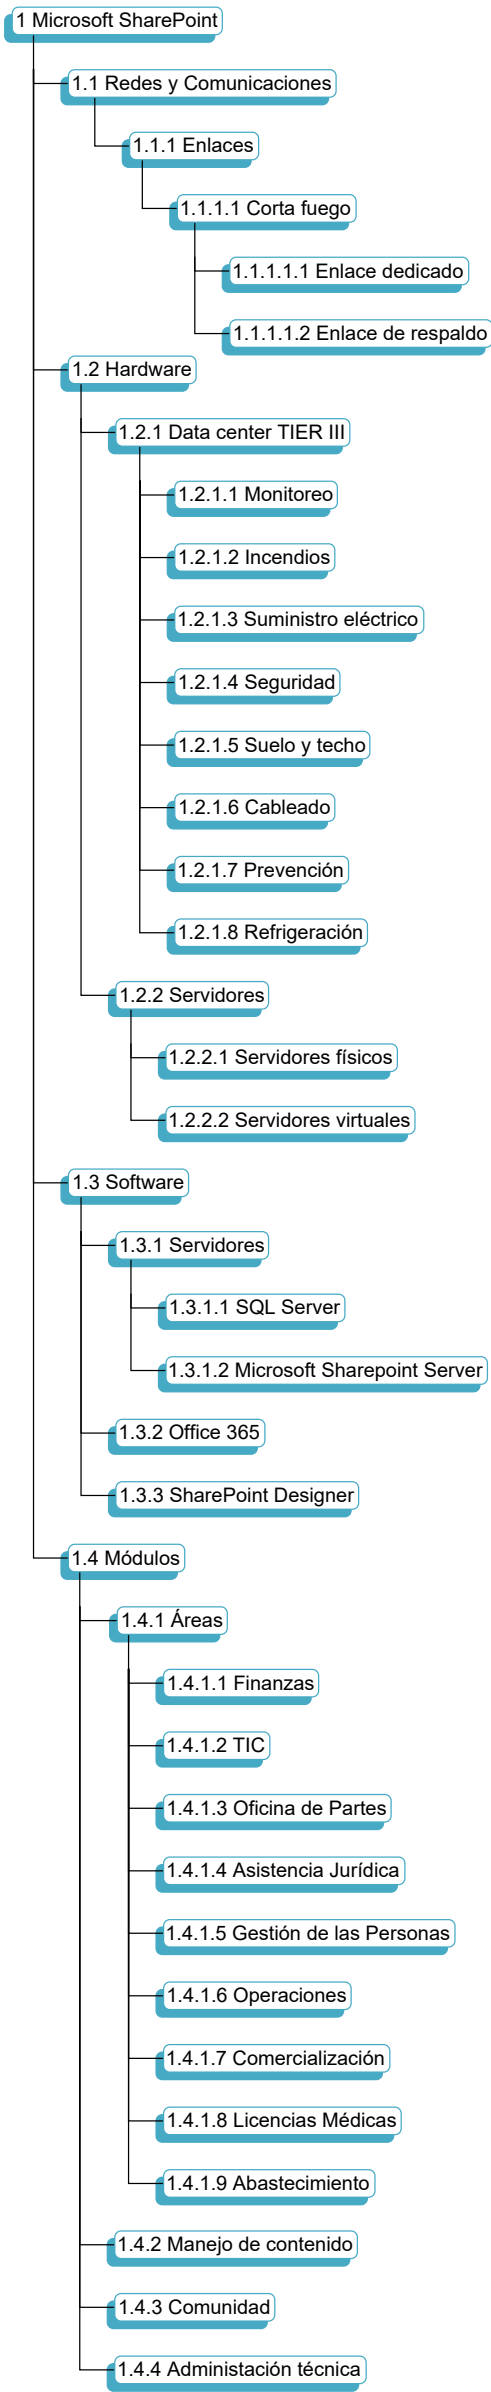

Conclusión.

Una vez puesta en práctica el uso de las herramientas pudimos ver de forma más clara el alcance del proyecto y la descomposición en un 100% de las actividades a desarrollar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Fue interesante descubrir el uso y aplicación de estas herramientas de planificación.

El trabajo en equipo a partir de reuniones y a veces de extensa duración permitió desarrollar y madurar este informe.

Todos los integrantes del equipo tenemos una mirada desde lo general hasta lo más particular del proyecto, sin embargo, a medida que avancemos en los módulos, nuestro proyecto podría ir sufriendo modificaciones.

Desde que nos constituimos como grupo, hemos aplicado la teoría en la ejecución práctica de nuestro proyecto; Trabajando documentos formales y usando herramientas tecnológicas que permiten desarrollar un plan para la gestión de proyectos, lo que nos permite concluir lo siguiente:


El documento del acta de constitución permitió desagregar cada componente de la estructura del proyecto, entregando una mirada de alto y bajo nivel, alcanzando un mejor entendimiento sobre la complejidad de la plataforma a implementar en el establecimiento de salud.

La WBS nos ayudó a abstraernos del proyecto en general y plasmarlo como un esquema para descomposición de trabajo. Nos aportó conocimiento para dividir las actividades en niveles desde un punto de vista general a específico.


La SBS nos ayudó a tener una visión sistémica de la solución, permitiendo descomponer la estructura física y lógica de la plataforma Microsoft SharePoint.

Por otra parte, los mapas mentales nos ayudaron a identificar y organizar las ideas para un prototipo de un futuro proyecto, de una forma más gráfica y amigable.

Anexos: Mapas Mentales

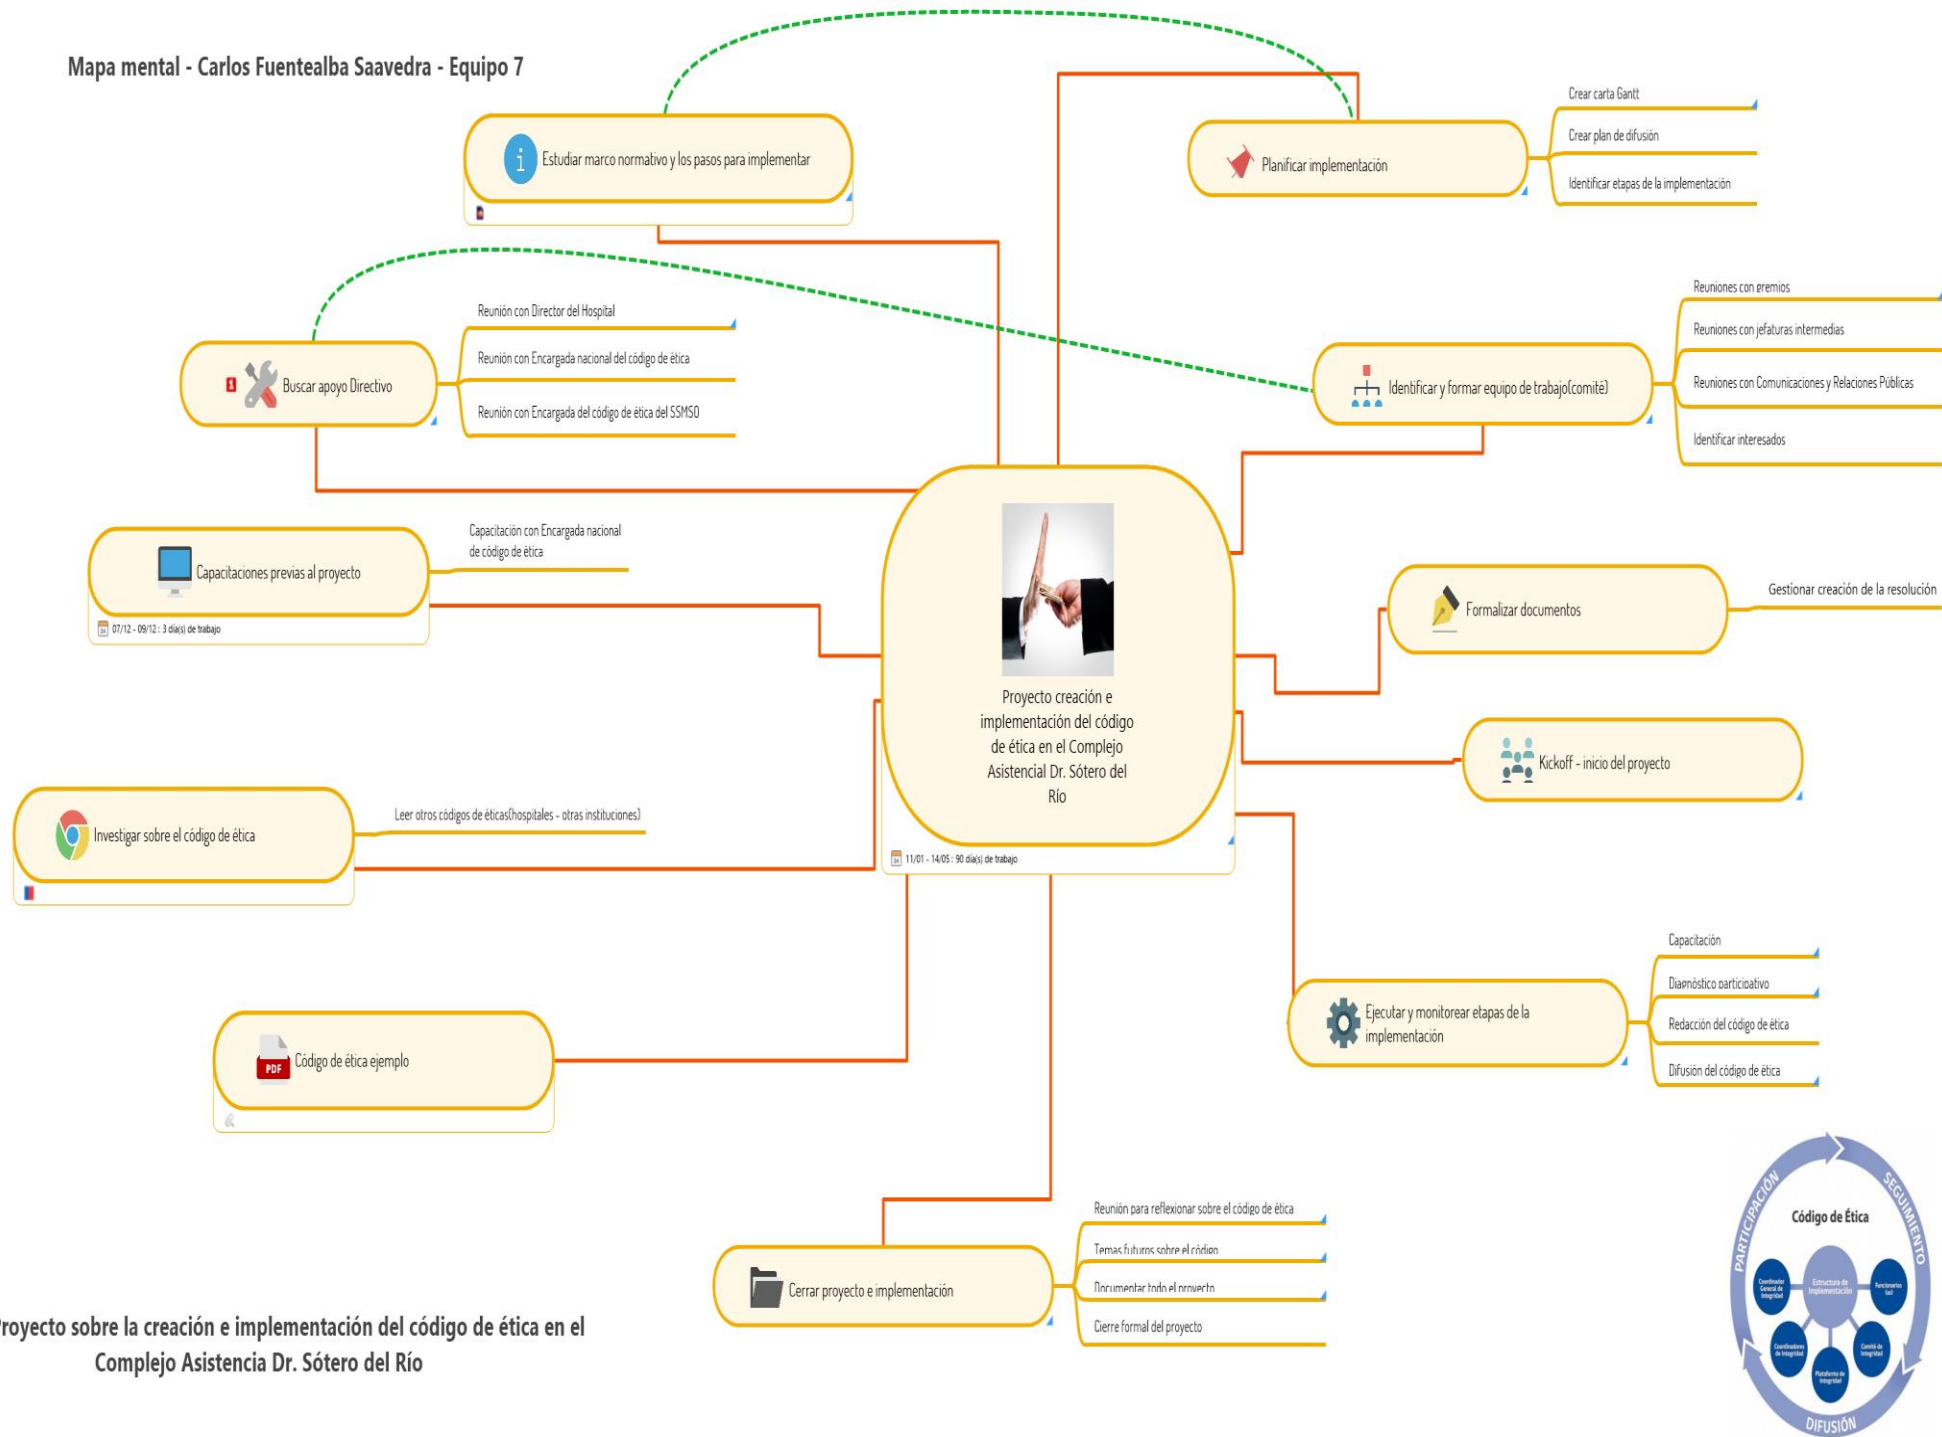

Mapa Mental - Miguel Liapiz - E7

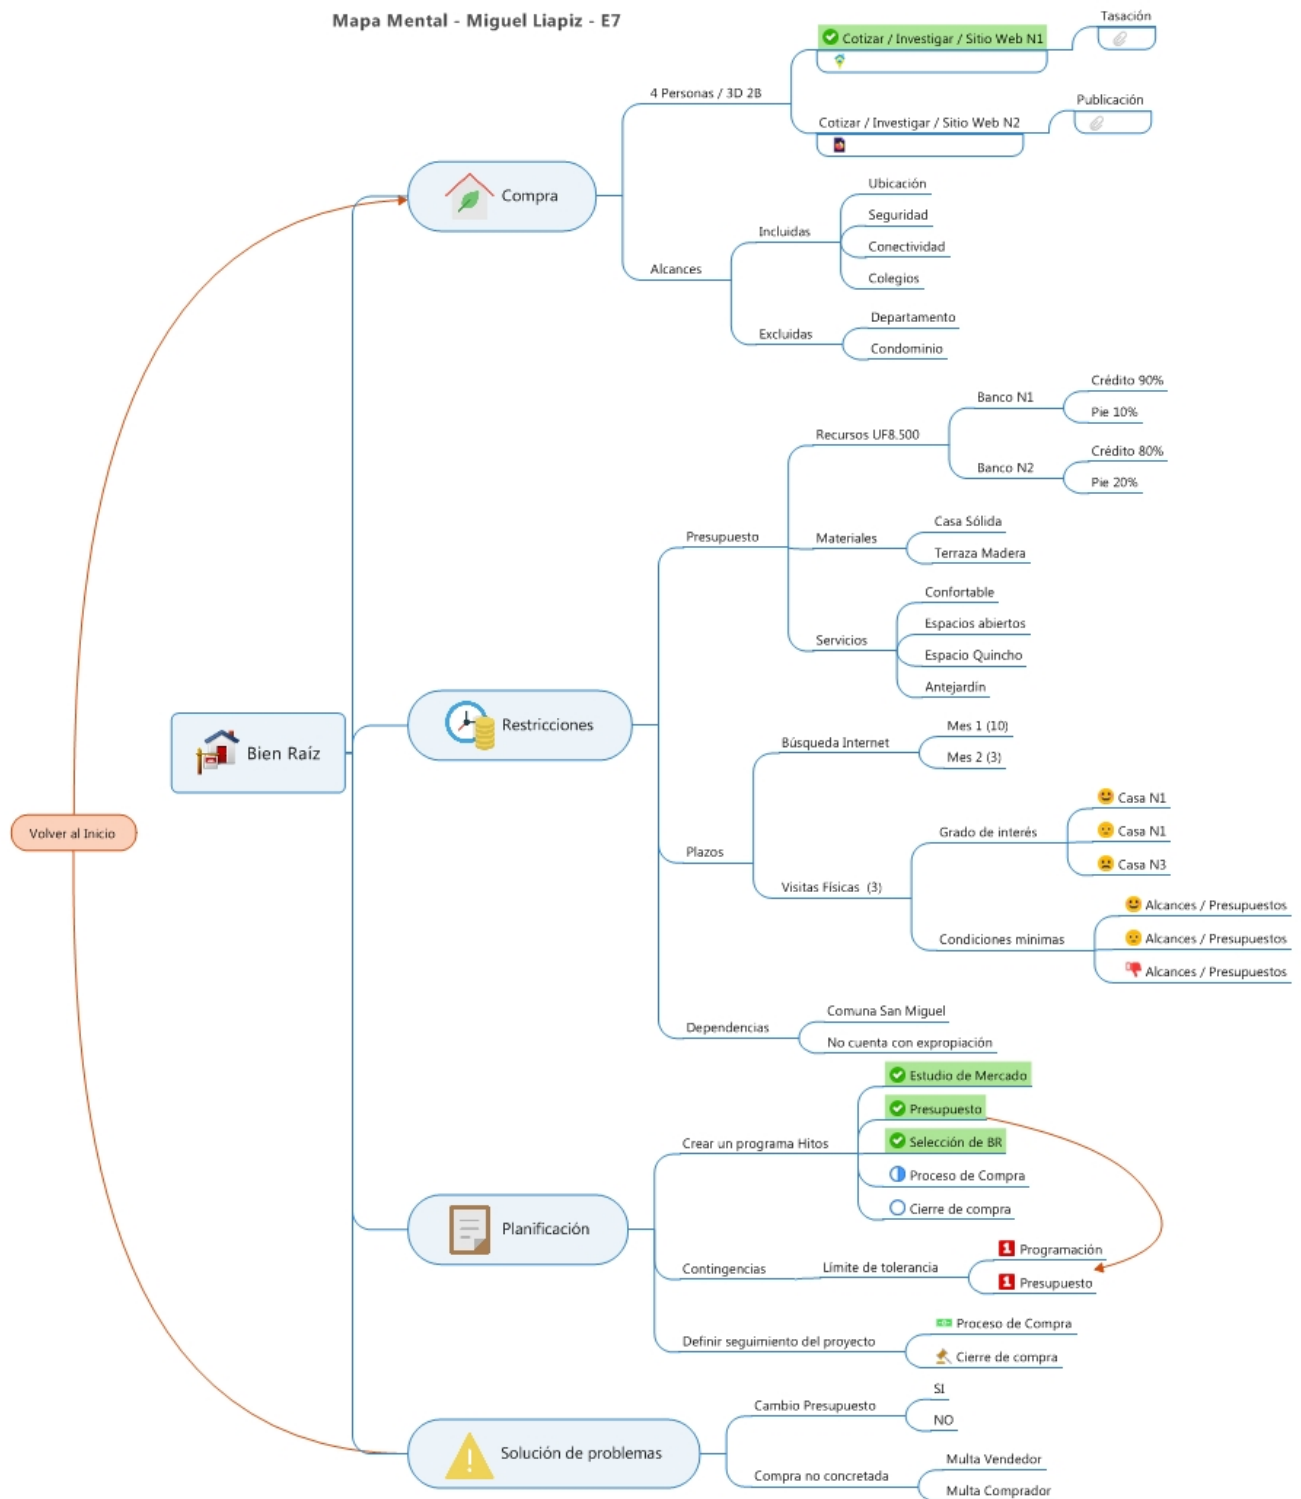

Elaborado por: Keila Machado

