



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN
PROFESIONAL

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS v88.-

4.2: Gestión de Recursos en Proyectos

Profesor: Humberto Gaete Bascour

Marzo 2025.-




Relator: Humberto Gaete Bascour

hrgaete@uc.cl



- MBA en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Universidad Diego Portales (2006).
- Ingeniero Comercial, Universidad Bernardo O'Higgins (1995).
- Director de Proyectos empresariales de la Universidad Bernardo O'Higgins (2016- 2018)
- Decano Facultad de Ingeniería y Administración Universidad Bernardo O'Higgins (2011- 2015)
- Director de Posgrados Universidad Bernardo O'Higgins (2010 - 2012).
- Profesor de la Escuela de Ingeniería de la PUC (2007-2009)
- Profesor en Control de Gestión, Economía, Administración I y II, Universidad Bernardo O'Higgins (1996- a la fecha).
- Jefe de Programa del Diplomado en Administración de Contratos , Educación Profesional Esc. Ing. PUC.
- Relator en temas de Gestión en diferentes Diplomados de la Esc. de Ingeniería PUC desde 2007 a la fecha.
- Gerente Div. Equipos y Gerente de Administración de Div. Obras B. Bosch S.A. (1996-2006)
- Oficial de Ejército (1976-1996)

Este Módulo en el Contexto del Diplomado

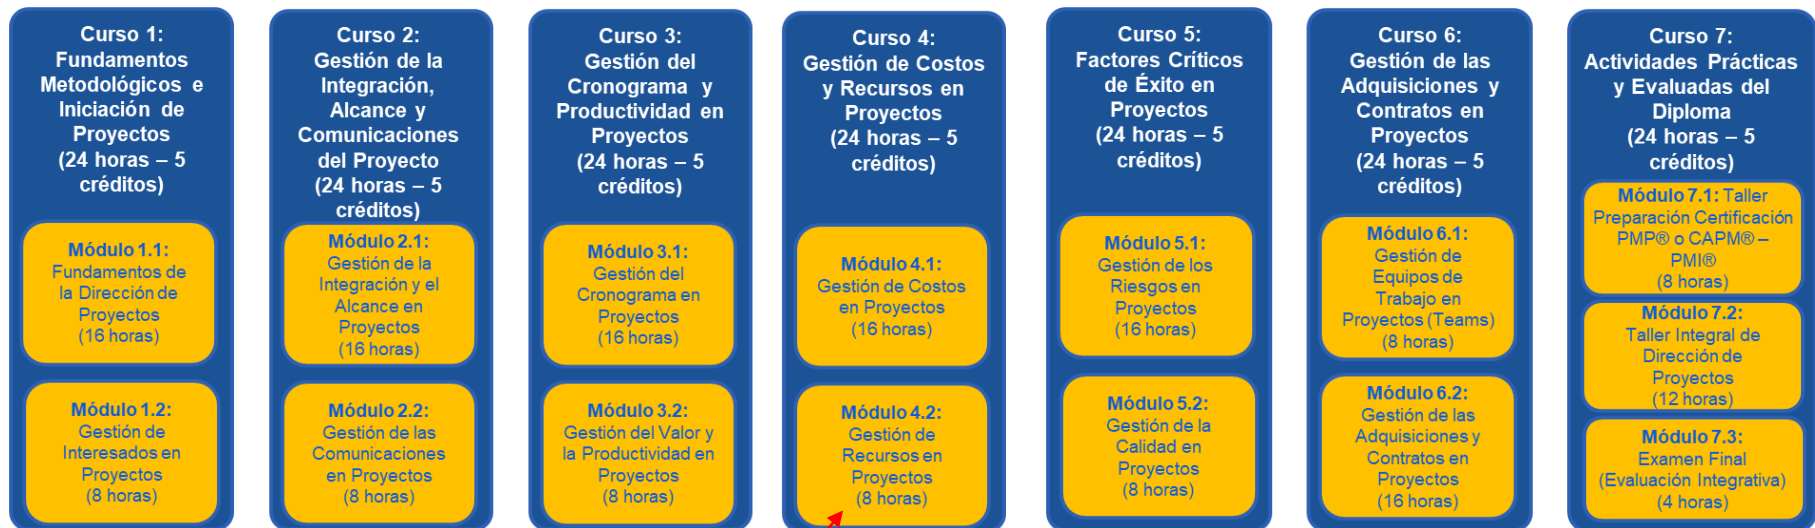

Hoy estamos acá

CONTENIDOS

Módulo 4.2: Gestión de Recursos en Proyectos (8 horas)

Resultados de Aprendizaje:

- Distinguir los principales enfoques de la gestión del recurso humano.
- Reconocer la importancia de explicitar la “Misión” a cada uno de los integrantes del equipo para el desarrollo de proyectos.
- Reconocer los 12 principios para la correcta ejecución de un proyecto.

Contenidos:

I.- Proceso Administrativo (desde la definición de Misión, Visión y Valores)

II.- Cambio de enfoque basado en procesos a enfoque basado en principios:

12 principios:

1.- Ser diligente, respetuoso y respetar la gobernanza.

2.- Crear una cultura de responsabilidad y respeto.

3.- Involucrar a los interesados y entender sus intereses y necesidades.

4.- Centrarse en el valor.

5.- Pensamiento holístico. Reconocer y responder a las interacciones de los sistemas.

6.- Motivar, influir, coach y enseñar.

7.- Adaptar la estrategia de la entrega basada en el contexto.

8.- Integrar la calidad en procesos y resultados.

9.- Enfrentar la complejidad a través del conocimiento, experiencia y aprendizaje.

10.- Oportunidades y amenazas. Enfrentarse a las oportunidades y amenazas.

11.- Adaptabilidad y resiliencia. Ser adaptable y resiliente.

12.- Gestión del cambio. Permitir el cambio para alcanzar el futuro deseado.



Metodología de enseñanza y aprendizaje:

Para lograr una efectiva y eficiente transferencia de conocimientos y adquisición de habilidades, **este curso considera la utilización del concepto de: aprender aplicando.**

Se integran dentro de las clases, diferentes dinámicas, que consideran: clases expositivas e interactivas, con apoyo de material audiovisual; discusión y análisis colectivo de los principales tópicos, con análisis de casos emblemáticos y ejemplos; talleres y ejercicios prácticos; lecturas de apoyo; discusión de casos en clases; aplicación de cuestionarios para discusión de temas.

Se trabaja ya sea en forma presencial o sincrónica (streaming) según cada versión y se cuenta siempre con un escritorio virtual de apoyo para el alumno (LMS Moodle).



EVALUACIONES

Evaluación de los aprendizajes:

Módulo 4.2 (pondera 40% de nota del curso):

Talleres aplicados (2): (100%).

- Trabajo aplicado N° 1 de Paradigmas: 40%
- Trabajo aplicado N° 2 de 12 principios: 60%



Este trabajo lo deben **realizar los equipos ya formados**, debiendo enviarlo al correo del relator hrgaete@uc.cl hasta el **viernes 28 de marzo de 2025 a las 18:00 hrs.** No se aceptan trabajos individuales.

El trabajo deberá venir escrito en word, arial 12, tamaño carta, en 3 páginas, explicando el desarrollo de cada pregunta. **ENVIAR EN PDF.**

Debe contener en la primera página (no incluida en las 3 de desarrollo), **los nombres de los integrantes y el número del equipo y nombre del proyecto.**

Este trabajo tiene una nota ponderada del 40% de la nota final del módulo.

Preguntas:

1.- Hagan una lista de los nuevos paradigmas respecto a RR. HH. (a lo menos 3) que estiman necesarios deben existir en su organización para que ésta sea exitosa. (Ejemplo de nuevos paradigmas: “La estabilidad y la seguridad la dan los cambios”). **Las respuestas se deben basar en la lectura obligatoria del Cap. 4 del libro EL ARTE DE DIRIGIR ORGANIZACIONES (pregunta 1)**

DEBEN INDICAR A LO MENOS UN PARADIGMA QUE IMPACTE POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN SU PROYECTO Y COMO SE APROVECHARÁ O MINIMIZARÁ SU IMPACTO.

2.- ¿Qué debo hacer yo como empresa u organización para que esta sea siempre interesante para los colaboradores? Se solicita ver las diferencias más importantes que se presentan entre las generaciones más antiguas y las generaciones **Millennials** (son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1993). Esto se debe basar en la experiencia de uno o varios integrantes del equipo.

3.- ¿Qué debo hacer y que actitud debo tener yo como colaborador para que la empresa u organización se fije en mí y me proyecte a futuro? Ej. Ser proactivo, actitud positiva, capacitación permanente, etc. Esto se debe basar en la experiencia de uno o varios integrantes del equipo.



TRABAJO APLICADO N° 2 DE PRINCIPIOS (60%)

Este trabajo lo deben realizar los equipos ya formados, debiendo enviarlo al correo del relator hrgaete@uc.cl hasta el viernes 28 de marzo de 2025 a las 18:00 hrs. No se aceptan trabajos individuales.

El trabajo deberá venir escrito en Word, arial 12, tamaño carta, en 3 páginas. **ENVIAR EN PDF.**

Debe contener en la primera página (no incluida en las 3 páginas de desarrollo), los nombres de los integrantes y el número del equipo y nombre del proyecto.

Este trabajo tiene una nota ponderada del 60% de la nota final del módulo.

Pregunta de Desarrollo:

1.- Después de leer y comprender los 12 principios expuestos en clases, expliquen en qué situación de un proyecto real (que haya participado algún alumno del equipo o bien que lo haya observado desde fuera) no se aplicaron algunos de estos principios, causando grave daño al desarrollo de este o estos. También pueden hacer este análisis desde el punto de vista positivo, es decir, como impactó positivamente un principio al respetarse este en forma estricta. Deben aplicar 3 principios (solo entre los principios 1, 2, 6, 11 y 12) a un solo proyecto, a dos o tres, según sea el caso. Debe profundizar en el análisis sobre cuál fue su impacto.

No se debe mencionar la organización o proyecto real, pudiendo cambiar su nombre por uno ficticio. Se debe considerar la fecha (año) en que ocurrió, no debiendo ser de antes del año 2020.

2.- Redactar una pequeña conclusión general respecto a los 3 casos de análisis.



Coordinación del Diplomado

Paulina Benvenuto
Coordinadora
Educación Profesional

Escuela de Ingeniería UC
Edificio Metrología, 4° piso. Campus San Joaquín
email: pbenvenuto@uc.cl

Áreas de Conocimiento según el PMBOK, PMI, 6ta edición

(numeración conforme al PMBOK 6ta edición)





I.- PROCESO ADMINISTRATIVO (DESDE LA DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES)

Entre estas causas... ¿Cuál es el factor común que las une?

Nº	Causa de Falla
1	Falta de compromiso de la gerencia en alguna etapa del proyecto
2	Deficiente definición y manejo de requerimientos (incompletos, inestables, etc)
3	Falla de trabajo en equipo (falta de integración) y/o falla de Liderazgo
4	Escasa o nula participación de "cliente/usuario" (y otras partes interesadas)
5	Deficiente comunicación y coordinación durante las etapas del proyecto
6	Insuficiente seguimiento y control del progreso y/o retroalimentación
7	Deficiente o nula planificación del proyecto (técnica y/o administrativa)
8	Deficiente estimación de tiempos, costos y riesgos
9	Falta de recursos humanos idóneos para el trabajo a realizar
10	Falta de continuidad de los especialistas (excesiva rotación)
11	Falta de visión integral (sistémica) del proyecto y sus entregables
12	Problemas de ingeniería y construcción



“La gestión exitosa de proyectos,
independientemente de la estructura organizativa, es
sólo tan buena como lo sean los individuos y líderes
que gestionen las funciones básicas”.

(Kerzner, 1998)

Un conjunto familiar de las áreas de conocimiento en DP

MÁS EXTENSA...

2.01
L
Liderazgo

2.03
Ac
Autocontrol

2.02
Cm
Compromiso y motivación

2.06
A
Actitud abierta

2.05
R
Relajación

2.04
Cn
Confianza en sí mismo

2.09
E
Eficiencia

2.08
Or
Orientación a resultados

2.07
Cr
Creatividad

2.12
Cc
Conflictos y crisis

2.11
Ne
Negociación

2.10
Co
Consulta

2.14
Av
Apreciación de valores

2.13
Fb
Fiabilidad

2.15
Et
Ética

1.20
Ce
Cierre

1.19
La
Lanzamiento

1.18
C
Comunicación

1.17
Id
Información y documentación

1.16
Ci
Control e informes

1.15
Cb
Cambios

1.14
Ac
Aprovisionamiento y contratos

1.13
Cs
Coste y financiación

1.12
Re
Recursos

1.11
Tf
Tiempo y fases de un proyecto

1.10
Ae
Alcance y entregables

1.09
Ep
Estructuras del proyecto

1.08
Rp
Resolución de problemas

1.07
Et
Equipos de trabajo

1.06
Op
Organización del proyecto

1.05
Ca
Calidad

1.04
Ro
Riesgo y oportunidad

1.03
Ro
Requisitos y objetivos del proyecto

1.02
Pi
Partes involucradas

1.01
Ex
Éxito en la dirección de proyectos

3.07
Si
Sistemas, productos y tecnologías

3.05
Or
Organizaciones permanentes

3.03
Oc
Orientación a carteras

3.02
Op
Orientación a programas

3.01
O
Orientación a proyectos

3.11
Le
Legal

3.09
Sh
Seguridad, higiene y medio-ambiente

3.06
Ne
Negocio

3.04
Ip
Implantación de proyectos, programas y carteras

3.02
Op
Orientación a programas

3.01
O
Orientación a proyectos

Basada en el
ICB® de IPMA
www.ipma.ch

¿Sabemos **TODOS**
hacia dónde nos
dirigimos?



¿Sabemos
TODOS que rol
jugamos en la
organización?


¿DÓNDE ESTÁ EL VALOR DE LAS ORGANIZACIONES HOY?

- La **Fuente de Valor** ha cambiado de activos **tangibles** a **intangibles**.

- Intangibles:


“Relaciones con clientes; procesos operativos de calidad, TI y bases de datos; capacidades; habilidades y motivación; cultura; esquema de incentivos; comunicación y coordinación.”

Porcentaje de valor de mercado relacionado con.....

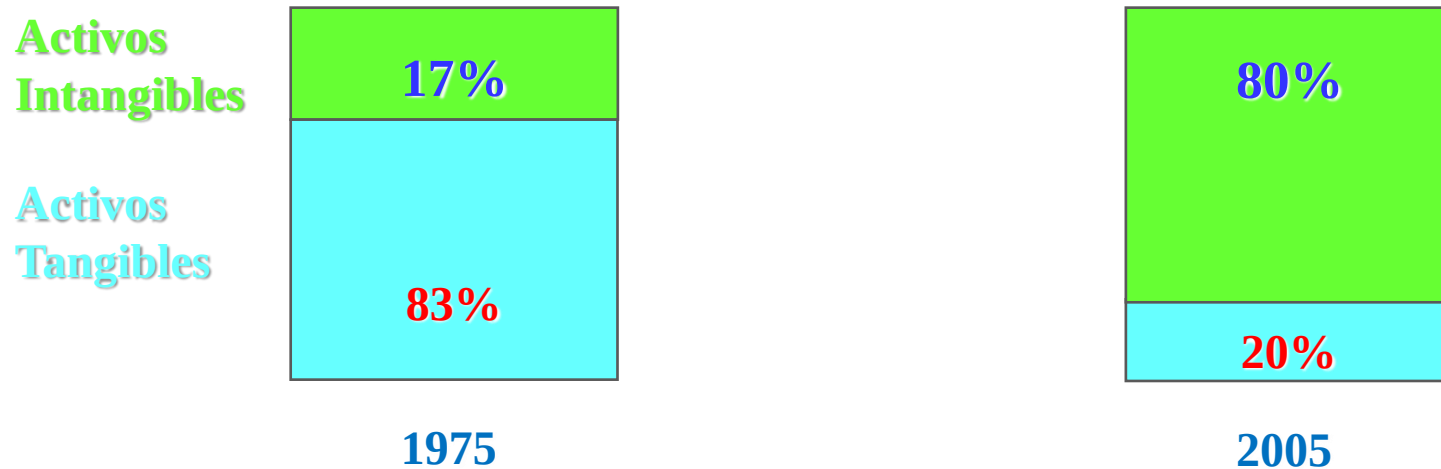

<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3905/4341>

Nos encontramos inmersos en un nuevo entorno de cambio permanente...

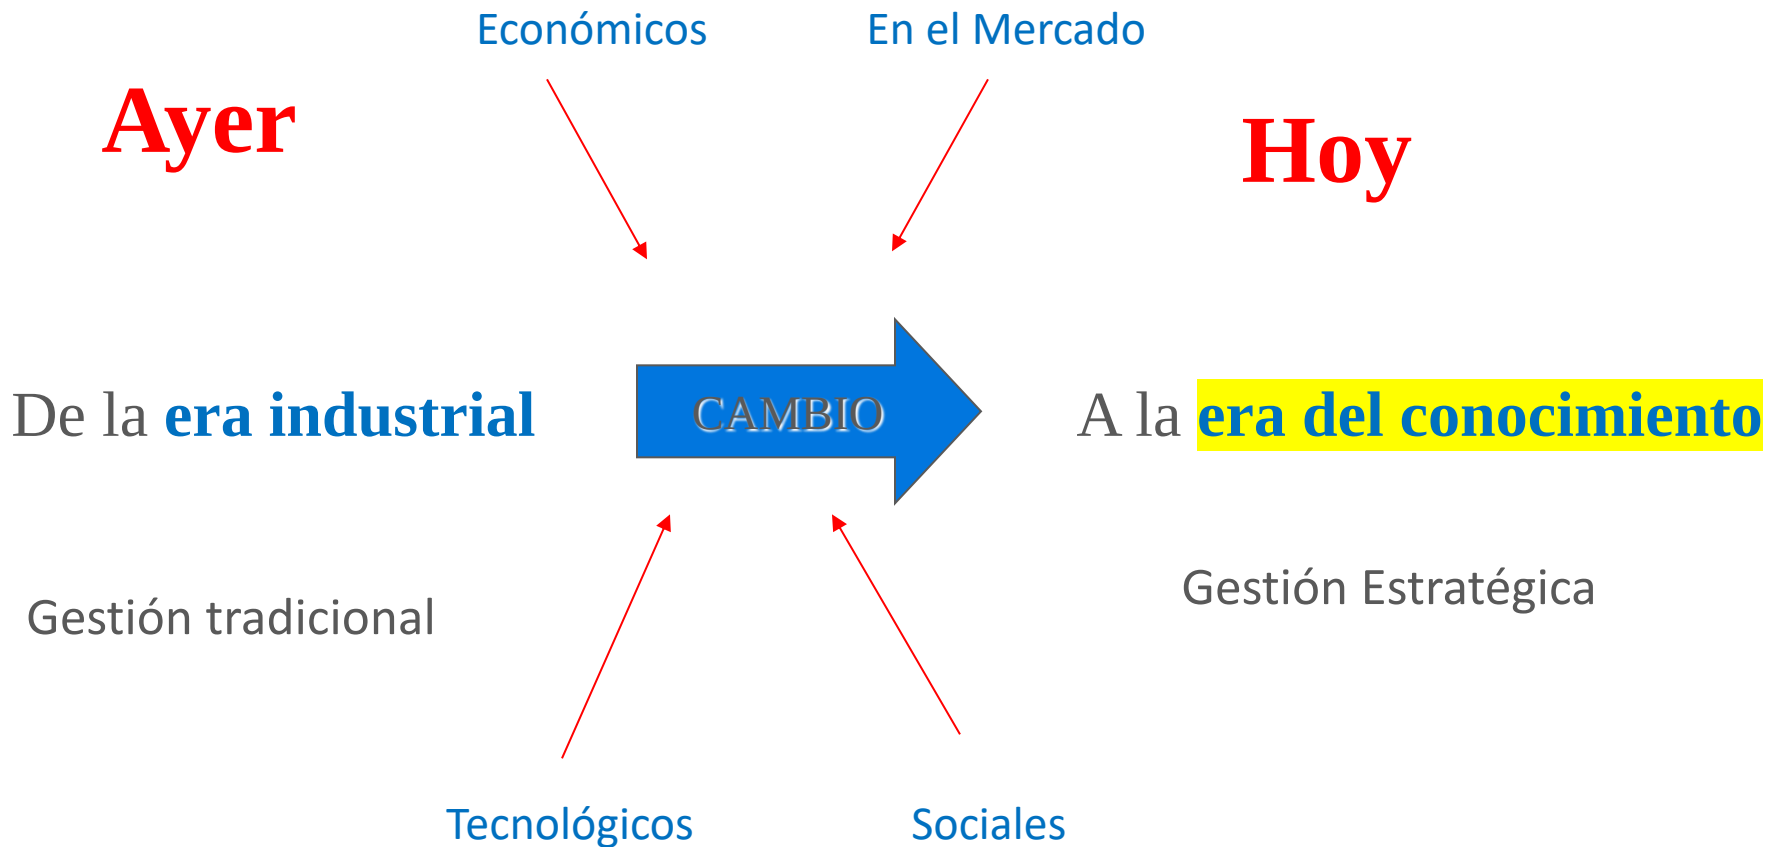



**Nunca dejes de aprender.
Cuanto más sepas, mejor
serán tus decisiones.**





ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN DEL CAMBIO

		Competencia	+	Incentivos	+	Recursos	+	Plan de Acción	=	Confusión
Visión	+		+	Incentivos	+	Recursos	+	Plan de Acción	=	Inseguridad
Visión	+	Competencia				Recursos	+	Plan de Acción	=	Resistencia
Visión	+	Competencia	+	Incentivos	+			Plan de Acción	=	Frustración
Visión	+	Competencia	+	Incentivos	+	Recursos			=	Trabajo monótono

Adaptación de:

Alaska Staff Development Network (http://www.asdn.org/gates_ak_qsc.html), 2002.



EL PROCESO DE OCHO ETAPAS PARA DAR ORIGEN AL CAMBIO FUNDAMENTAL

- 1.- Infundir el sentido de urgencia
- 2.- Dar origen a la coalición orientadora
- 3.- Desarrollar una visión y una estrategia
- 4.- Comunicar la visión del cambio
- 5.- Facultar una base amplia para la acción
- 6.- Generar triunfos a corto plazo
- 7.- Consolidar las ganancias y generar más cambios.
- 8.- Arraigar los nuevos enfoques en la cultura

Libro “Líder del cambio” de J. Kotter



Declaración Estratégica

Son *Lineamientos Centrales o Guías* para la acción que direccionan el funcionamiento de toda organización.

Visión

- Es la **imagen de futuro** e idealizada de lo que se **desea crear**, descrita en tiempo presente.
- Muestra a **donde se quiere ir** y como será la organización cuando se llegue

Declaración Estratégica

Misión

- Formulación explícita del “Propósito Duradero” que distingue a la organización de otras y le confiere identidad.
- Especifica el rol funcional que la organización va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus actividades (Razón de ser)
- Incentiva el sentido de pertenencia de los miembros de la organización
- **Considera:** Alcance geográfico, Segmentos de Mercado, Tipos de Productos o Servicios, Tipo de Liderazgo competitivo y grupos de interés (Stakeholders: accionistas, clientes, sociedad, estado, colaboradores, proveedores, etc.)



Ejemplos de Misión

- “Nuestra misión es proporcionar a cualquier cliente un medio de trasladar personas y objetos, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados en distancias cortas con mayor confiabilidad que cualquier empresa similar en el mundo” (Ascensores OTIS).
- “La misión de Levi Strauss & Co., es mantener un éxito comercial rentable y responsable por medio de comercializar jeans y ropa en general, bajo la marca Levi's. Debemos balancear las metas de una alta utilidad y retorno sobre la inversión, una posición de liderazgo en el mercado y productos y servicios de alto nivel. Conduciremos nuestro negocio éticamente y demostraremos nuestro liderazgo por medio de satisfacer nuestras responsabilidades con la comunidad y la sociedad. Nuestro ambiente de trabajo será seguro y productivo y caracterizado por un tratamiento equitativo, trabajo en equipo, comunicaciones abiertas, responsabilidad personal y oportunidades de crecimiento y desarrollo”.



Evaluación de la misión

- ¿Establece claramente el negocio en que estamos?
- ¿Pueden todos los empleados comprender la contribución que ellos hacen a nuestra misión?
- ¿Es la misión estable?
- ¿Puede sobrevivir la misión a cambios en la gerencia?
- ¿Contesta la misión quienes somos, qué y para quién hacemos lo que hacemos y por qué es importante?
- ¿Es claro por qué usamos el capital de la empresa en dicho esfuerzo?
- ¿Nos avergonzaríamos si viéramos nuestra misión en los medios?
- ¿Nuestra misión enuncia bien los resultados deseados?



Declaración Estratégica


Valores

- Marco perceptivo relativamente permanente que conforma e influencia la naturaleza general de la conducta.
- Se enfoca a : Organización, Colaboradores, Clientes, Comunidad, Proveedores, Estado, Otros.



PROCESO ADMINISTRATIVO

VISIÓN - MISIÓN (PROPÓSITO) - VALORES

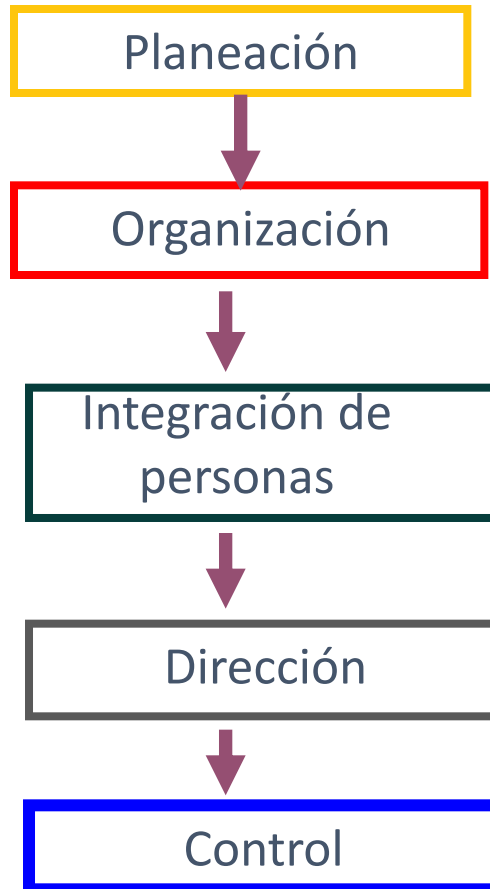



PLANIFICACIÓN	ORGANIZACIÓN	INTEGRACIÓN DE PERSONAS	DIRECCIÓN	CONTROL
Estrategia (¿ como cumpliremos la misión?)	Organigrama	De acuerdo a Competencias necesarias para cumplir la estrategia	Motivación	Se debe controlar lo planificado
Objetivos (siempre un objetivo comienza con verbo en infinitivo. Ejemplo: aumentar, mantener, disminuir, etc)	Perfiles de cargo		Liderazgo	
Metas e indicadores			Comunicación	
Proyectos , Planes de acción, Iniciativas, actividades.			Trabajo en equipo	
Políticas y normas			Gestión del conocimiento	
Presupuesto				

ALGUNAS DEFINICIONES

El **liderazgo** es el conjunto de habilidades directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.

También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea este personal o institucional.

La palabra **motivación** deriva del latín *motivus* o *motus*, que significa 'causa del movimiento'. La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo».

La **comunicación** (del latín *communicatio*, -ōnis.) es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor.



- La integración de personas consiste en ocupar y mantener los puestos de la Estructura Organizacional.
- Las personas son vitales para la operación eficiente de una compañía o proyecto.
- Los “Activos humanos” son el activo más importante, pero no aparece nunca en los balances generales, a pesar de la gran cantidad de dinero que se invierte en el reclutamiento, selección y capacitación de personas.




- La integración de personas es una de las funciones decisivas de los administradores, capaz de determinar el éxito o fracaso de un proyecto.
- Se vincula estrechamente con la función de “Organización” (establecimiento de estructuras intencionales de funciones y puestos).
- Una adecuada integración de personal facilita la “Dirección” y el “Control”



Responsabilidad sobre la integración de personas

- Debe recaer en todos los administradores y en todos los niveles, pero la responsabilidad final es del Gerente general o Jefe del proyecto.
- Deben tomar decisiones respecto a políticas, promoción interna, proceso de selección a aplicar, etc.
- Los administradores de línea deben recurrir a las áreas de Recursos Humanos (reclutamiento-selección-contratación-ascenso-evaluación-capacitación)



Integrando organizaciones & personas





CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura organizacional

Puede definirse como la **agrupación de normas, estándares y valores compartidos** por los miembros de una organización que afectan la forma como desarrolla los negocios.

La Socialización

Es el término utilizado para describir cómo las **personas aprenden la cultura organizacional**.

La cultura de una organización es transmitida a sus miembros a través de historias, mitos y el lenguaje que utilizan las personas en la organización.



CULTURA Y LIDERAZGO ESTRATEGICO

Los **valores compartidos** y la cultura común permiten:

- Mejor integración y coordinación entre los miembros de la organización.
- Las reglas, procedimientos y supervisión sean menos importantes para el control del comportamiento de las personas.

Con el tiempo, las normas y valores de la cultura organizacional pueden *sesgar la toma de decisiones* y hacer que los Directivos perciban una realidad incorrecta de la situación que enfrenta la organización **(Parálisis paradigmática)**

SE debe profundizar el tema de Paradigmas en el texto adjunto EL ARTE DE DIRIGIR ORGANIZACIONES de Andrés Lalanne cap. 4 Los nuevos paradigmas de gestión.

Se **genera el peligro** que sean incapaces de guiar la organización en una **nueva dirección estratégica** si el ambiente se transforma, los nuevos competidores y la tecnología exige el cambio.

LA CULTURA PUEDE PROMOVER LA INERCIA

“La cultura organizacional empieza por la manera en que los empleados se ven a sí mismos dentro de la empresa y dentro de los proyectos en los que trabajan....”

—Bob Bulger, WH Pacific

La cultura organizacional marca la pauta que finalmente da forma a las experiencias comunes de los empleados. La mayoría de las organizaciones han desarrollado culturas organizacionales únicas con el tiempo, mediante la práctica y el uso común. Las experiencias comunes identificadas en la *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* incluyen, entre otras:

- Visión de futuro, valores de la misión, creencias y expectativas compartidas
- Regulaciones, políticas, métodos y procedimientos
- Sistemas de motivación y recompensa
- Tolerancia a los riesgos
- Criterios sobre el liderazgo, las jerarquías y las relaciones con la autoridad
- Códigos de conducta, ética de trabajo y horas laborales
- Entornos operativos


Estas características indican que la cultura organizacional y el estilo se aprenden y pueden compartirse, y además influyen notablemente en la capacidad de un proyecto para cumplir con sus objetivos.⁴

ESTRATEGIA


*CONSTRUIR UNA POSICIÓN
ÚNICA Y VALIOSA,
DENTRO DEL ENTORNO COMPETITIVO,
PARA QUE LA EMPRESA
LOGRE UN RETORNO,
QUE LE PERMITA SUSTENTARSE Y DESARROLLARSE EN EL
TIEMPO.*



Colocando la Estrategia en el centro de la Organización

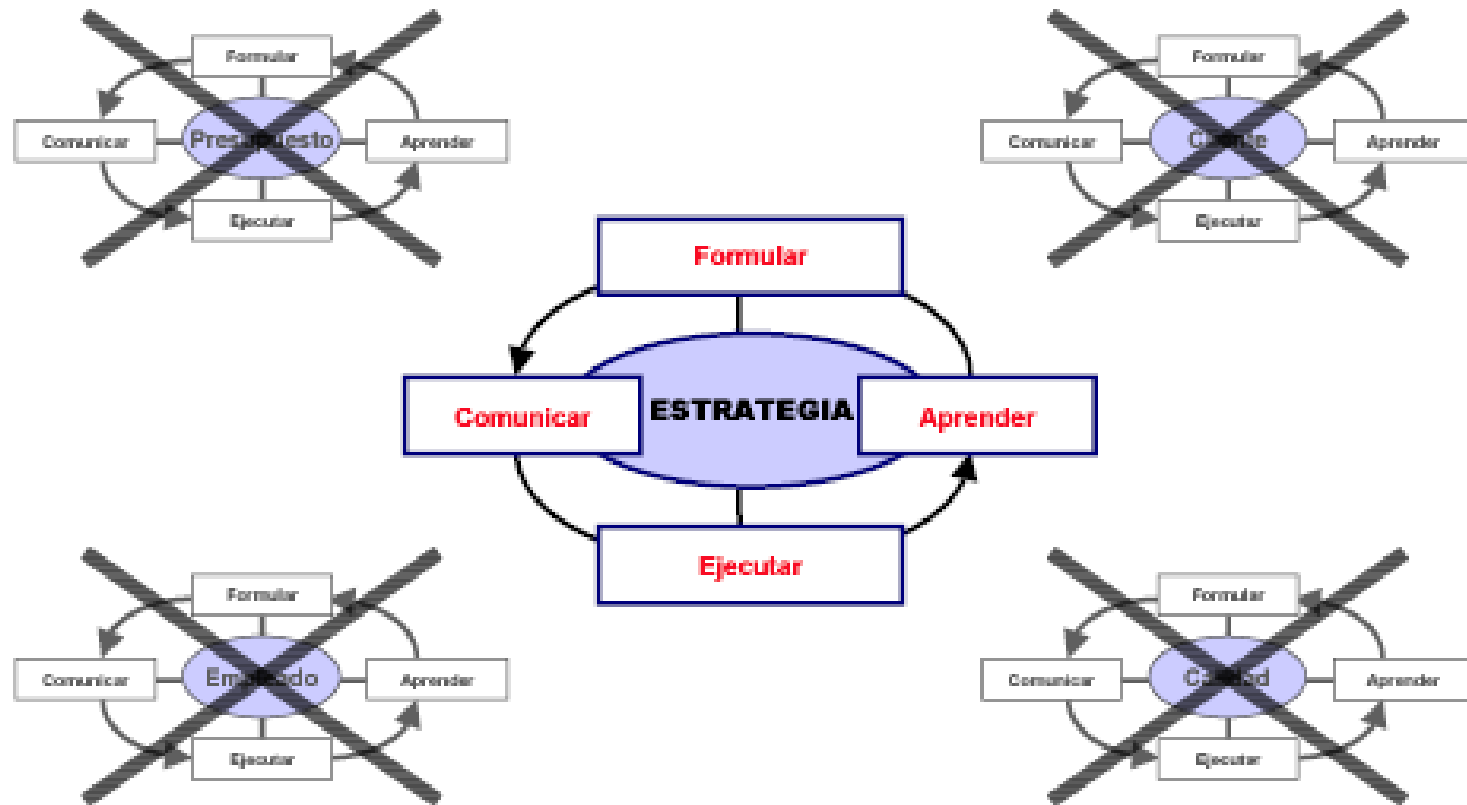


La Clave de la Empresa Actual

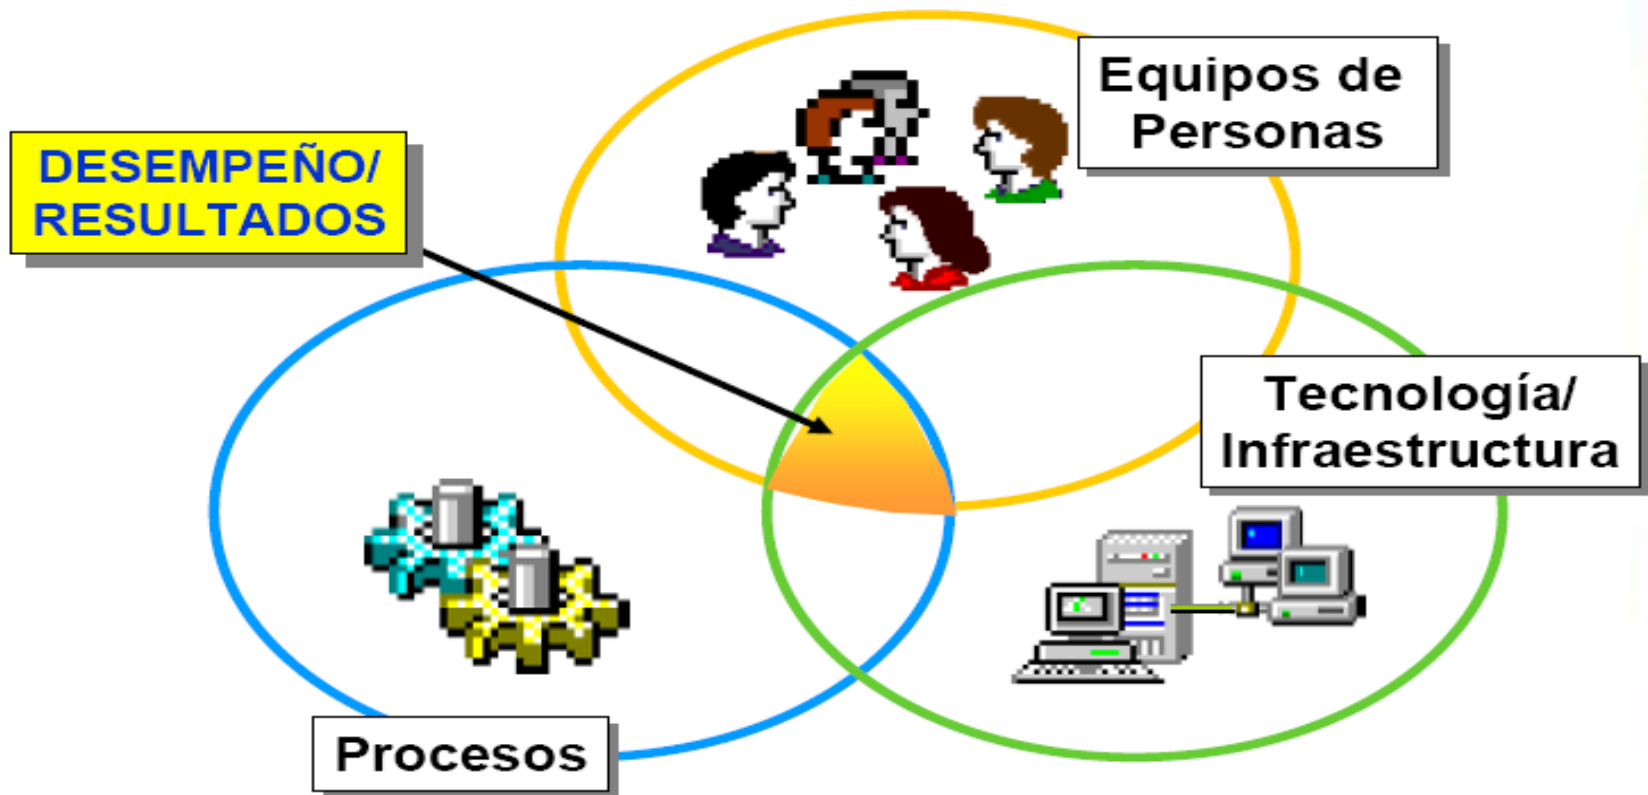

Las organizaciones (Proyectos) son...

Redes de personas con
competencias que...

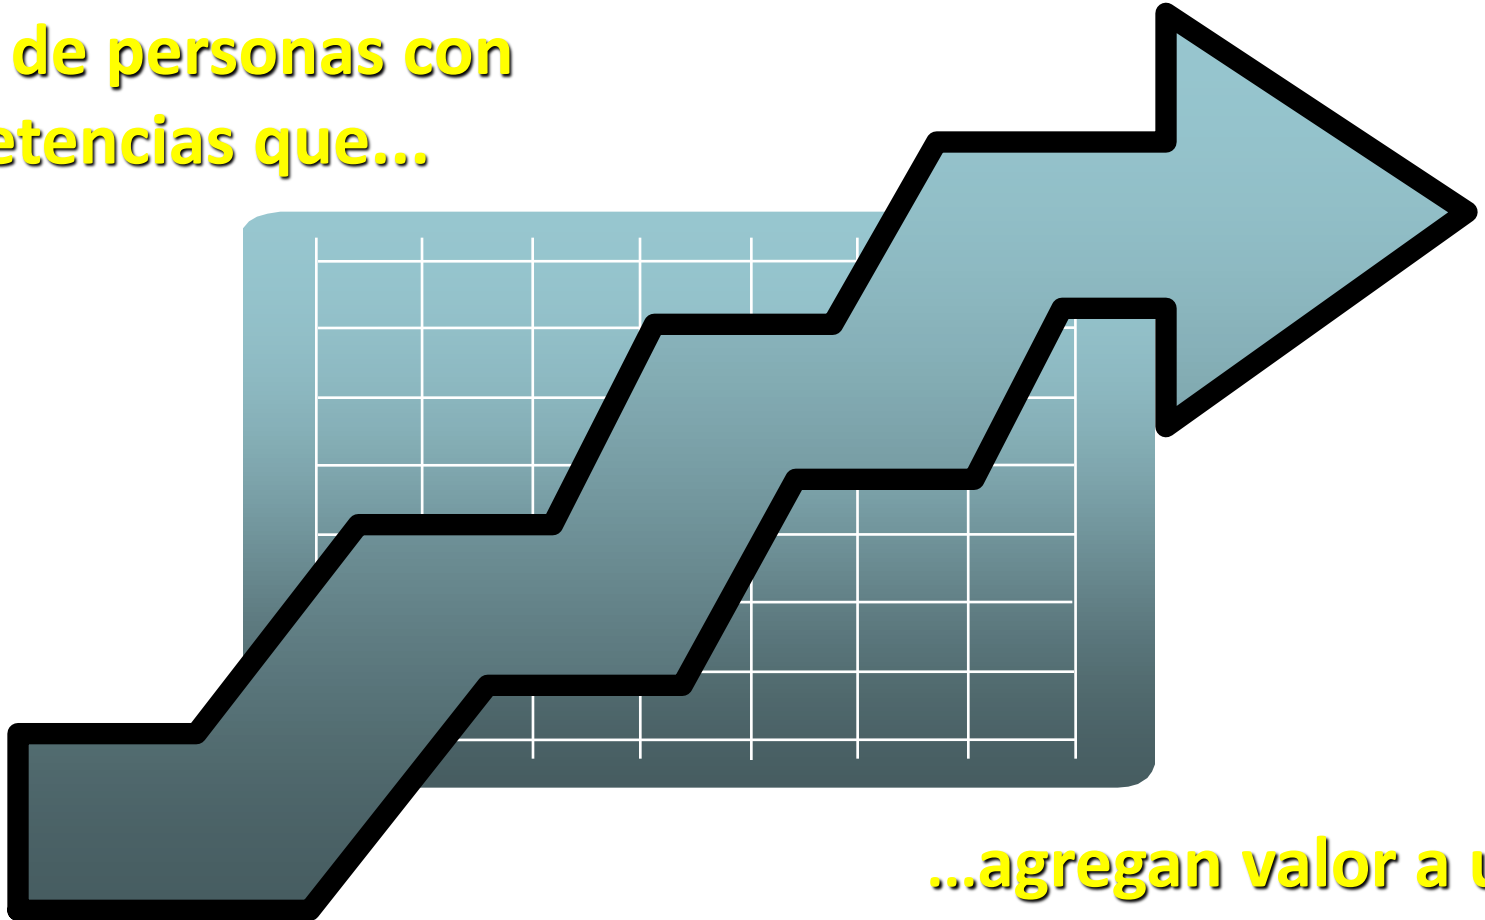

...agregan valor a un
producto o proceso



Este trabajo lo deben **realizar los equipos ya formados**, debiendo enviarlo al correo del relator hrgaete@uc.cl hasta el **viernes 28 de marzo de 2025 a las 18:00 hrs.** No se aceptan trabajos individuales.

El trabajo deberá venir escrito en word, arial 12, tamaño carta, en 3 páginas, explicando el desarrollo de cada pregunta. **ENVIAR EN PDF.**

Debe contener en la primera página (no incluida en las 3 de desarrollo), **los nombres de los integrantes y el número del equipo y nombre del proyecto.**

Este trabajo tiene una nota ponderada del 40% de la nota final del módulo.

Preguntas:

1.- Hagan una lista de los nuevos paradigmas respecto a RR. HH. (a lo menos 3) que estiman necesarios deben existir en su organización para que ésta sea exitosa. (Ejemplo de nuevos paradigmas: “La estabilidad y la seguridad la dan los cambios”). **Las respuestas se deben basar en la lectura obligatoria del Cap. 4 del libro EL ARTE DE DIRIGIR ORGANIZACIONES (pregunta 1)**

DEBEN INDICAR A LO MENOS UN PARADIGMA QUE IMPACTE POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN SU PROYECTO Y COMO SE APROVECHARÁ O MINIMIZARÁ SU IMPACTO.

2.- ¿Qué debo hacer yo como empresa u organización para que esta sea siempre interesante para los colaboradores? Se solicita ver las diferencias más importantes que se presentan entre las generaciones más antiguas y las generaciones **Millennials** (son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1993). Esto se debe basar en la experiencia de uno o varios integrantes del equipo.

3.- ¿Qué debo hacer y que actitud debo tener yo como colaborador para que la empresa u organización se fije en mí y me proyecte a futuro? Ej. Ser proactivo, actitud positiva, capacitación permanente, etc. Esto se debe basar en la experiencia de uno o varios integrantes del equipo.



II.- CAMBIO DE ENFOQUE BASADO EN PROCESOS A ENFOQUE BASADO EN PRINCIPIOS

Proyectos

- Un proyecto es un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
- Las personas planean, organizan, dirigen y controlan proyectos u organizaciones.
- Las personas están dotadas de características propias de personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, motivaciones y objetivos individuales, además de competencias necesarias para la tarea organizacional.

Proyectos y planificación estratégica

- Los proyectos son una **forma de organizar actividades** que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización.
- Por lo tanto, los proyectos se usan a menudo como **un medio de lograr el plan estratégico** de la organización.
- Generalmente, los proyectos son autorizados como resultado de una o más de las siguientes **consideraciones estratégicas**:
 - Una demanda del mercado
 - Una necesidad de la organización
 - Una solicitud de un cliente
 - Un avance tecnológico
 - Un requisito legal



- Desarrollar el Plan de Recursos Humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de personas.
- La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.
- El equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto.



- Los miembros del equipo deberían participar en gran parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto.
- La participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia durante el proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto.
- El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden cambiar, a medida que avanza el proyecto.

¿Quiénes conforman el equipo?

- Los miembros (todos) del “**equipo del proyecto**” se denominan también “personal del proyecto”.
- Equipo de “**dirección del proyecto**” (o equipo central o equipo ejecutivo o equipo de liderazgo) es parte del equipo del proyecto. Este es responsable de las actividades de Dirección (Planificación, control y cierre).
- El “**patrocinador del proyecto**” trabaja con el equipo de dirección del proyecto, ayudando generalmente con cuestiones tales como la financiación del proyecto, aclarando preguntas sobre el alcance y ejerciendo influencia sobre otros a fin de beneficiar al proyecto.



CONTROL DE GESTIÓN


Para controlar, primero hay que definir que es GESTIÓN, y después ver de que forma se puede CONTROLAR ESA GESTIÓN.

Gestión es un **conjunto de decisiones y acciones** requeridas para hacer que un ente cumpla su propósito formal, de acuerdo a su misión en el contexto y bajo la guía de una planificación de sus esfuerzos.

Gestión comprende el **proceso de técnicas, conocimientos y recursos**, para llevar a cabo la solución de tareas eficientemente.

<https://www.ucipfg.com/Repositorio/MLGA/MLGA-03/semana2/indicadores-de-gestion.pdf>

Pilares de la Gestión

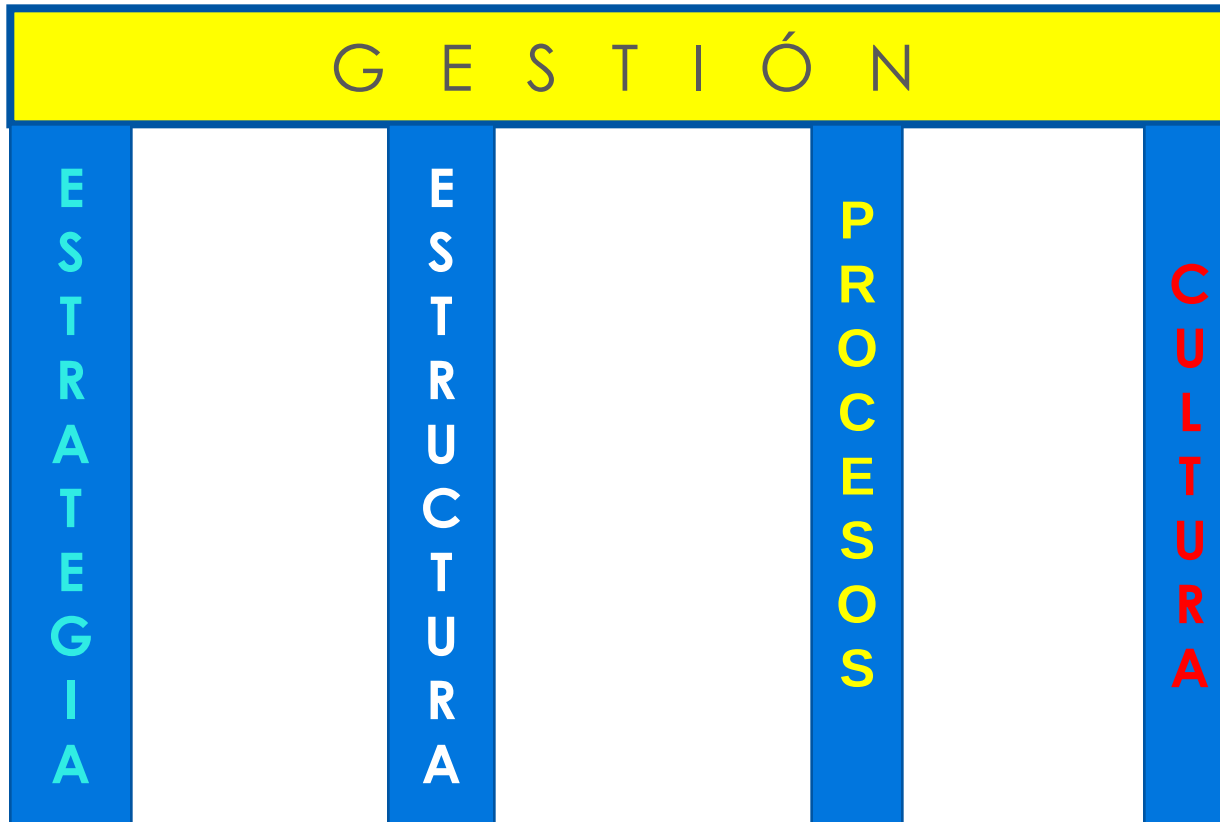

“La gestión sin acción es un sueño. la acción sin gestión es simplemente pasar el tiempo. Acción con gestión es hacer una diferencia positiva.” JACK WELCH JR.

Elementos de gestión en Proyectos

Los elementos de gestión son los componentes que comprenden las funciones o principios clave de la dirección general de la organización. Los elementos de la dirección general se asignan dentro de la organización según su marco de gobernanza y el tipo de estructura organizacional seleccionada.

Las funciones o principios clave de dirección incluyen, entre otros:

- ◆ **División del trabajo** usando habilidades especializadas y la disponibilidad para realizar trabajo;
- ◆ **Autoridad** otorgada para realizar trabajo;
- ◆ **Responsabilidad** de realizar trabajo debidamente asignado en base a atributos como habilidad y experiencia;
- ◆ **Disciplina** de acción (p.ej., el respeto por la autoridad, las personas y las reglas);
- ◆ **Unidad de mando** (p.ej., sólo una persona da órdenes a un individuo con relación a cualquier acción o actividad);
- ◆ **Unidad de dirección** (p.ej., un plan y un encargado para un grupo de actividades con el mismo objetivo);
- ◆ **Metas generales** de la organización tienen prioridad sobre las metas individuales;
- ◆ **Pago justo** por el trabajo realizado;

Elementos de gestión en Proyectos

- ◆ Uso óptimo de los recursos;
- ◆ Canales de comunicación claros;
- ◆ Materiales adecuados para la persona adecuada y el trabajo adecuado en el momento adecuado;
- ◆ Trato justo e igualitario de las personas en el lugar de trabajo;
- ◆ Clara seguridad de los puestos de trabajo;
- ◆ Seguridad de las personas en el lugar de trabajo;
- ◆ Contribución abierta a la planificación y ejecución por parte de cada persona; y
- ◆ Moral óptima.

El desempeño de estos elementos de gestión se asigna a individuos seleccionados dentro de la organización. Estos individuos pueden desempeñar las funciones mencionadas en el marco de diversas estructuras organizacionales. Por ejemplo, en una estructura jerárquica, existen niveles horizontales y verticales dentro de la organización. Estos niveles jerárquicos abarcan desde el nivel de gerencia de línea hasta el nivel de dirección ejecutiva. La responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad asignadas al nivel jerárquico indican cómo el individuo puede desempeñar la función mencionada en el marco de esa estructura organizacional.



Principios de la Dirección de Proyectos

- Los principios para una profesión sirven como **pautas fundamentales para la estrategia, toma de decisiones y resolución de problemas.**
- Los **estándares y metodologías** profesionales a menudo se basan en **principios**.
- En algunas profesiones, los principios sirven como leyes o reglas, y por lo tanto son de naturaleza prescriptiva (indica que es lo que debe hacer).
- Los **principios de la dirección de proyectos no son de naturaleza prescriptiva (regular, establecer o formular alguna cosa)**. Están concebidos para **guiar el comportamiento de las personas** involucradas en los proyectos.
- **Son de base amplia**, por lo que **hay muchas maneras en que las personas y las organizaciones pueden mantener la alineación con los principios**. Los principios pueden, pero no necesariamente, reflejar la ética.
- Un código de ética está relacionado con la moral.
- Una persona o profesión puede adoptar un código de ética para una profesión con el fin de establecer expectativas para la conducta moral.
- El **Código de Ética y Conducta Profesional del PMI está basado en cuatro valores** que fueron identificados como los más importantes para la comunidad de dirección de proyectos:
 - **Responsabilidad, ► Respeto, ► Imparcialidad, y ► Honestidad**

- **Los 12 principios de la dirección de proyectos están alineados con los valores** identificados en el Código de Ética y Conducta Profesional del PMI.
- No siguen el mismo formato, y no están duplicados, sino que **los principios y el Código de Ética son complementarios**.
- Los principios de la dirección de proyectos fueron identificados y **desarrollados mediante la participación de una comunidad mundial de profesionales de proyectos**.
- Los profesionales representan diferentes industrias, orígenes culturales y organizaciones en diferentes roles y con experiencia en diversos tipos de proyectos.
- **Múltiples rondas de retroalimentación dieron como resultado 12 principios que proporcionan orientación** para una dirección de proyectos eficaz.

- Debido a que los **principios de la dirección de proyectos proporcionan orientación**, el grado de aplicación y la forma en que se aplican vienen influenciados por **el contexto de la organización, el proyecto, los entregables, el equipo del proyecto, los interesados y otros factores**.
- Los principios **son internamente coherentes**, lo que significa que ningún principio contradice ningún otro principio.
- Sin embargo, en la práctica **se pueden presentar momentos en que los principios puedan superponerse**.
- Por ejemplo, la orientación para navegar por la complejidad puede presentar información útil para reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema u optimizar las respuestas a los riesgos. **Los principios de la dirección de proyectos también pueden tener áreas de superposición con los principios generales de gestión.**
- Por ejemplo, tanto los proyectos como el negocio en general se centran en entregar valor.
- Los métodos pueden ser algo diferentes en los proyectos en comparación con las operaciones, pero puede aplicarse a ambos el principio subyacente asociado con centrarse en el valor.

Las etiquetas de los principios **se enumeran aquí sin ponderación u orden específico.**

Cada sección comienza con un gráfico que proporciona la etiqueta principal en la parte superior con el principio y los puntos clave debajo de la etiqueta

Los 12 principios son:

- 1.- Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso
- 2.- Crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto
- 3.- Involucrarse eficazmente con los Interesados
- 4.- Enfocarse en el valor
- 5.- Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema
- 6.- Demostrar comportamientos de liderazgo
- 7.- Adaptar en función del contexto
- 8.- Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
- 9.- Navegar en la complejidad
- 10.- Optimizar las respuestas a los riesgos
- 11.- Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia
- 12.- Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

1.- SER UN ADMINISTRADOR DILIGENTE, RESPETUOSO Y CUIDADOSO

ADMINISTRACIÓN

Los administradores actúan de manera responsable para llevar a cabo las actividades con integridad, cuidado y confiabilidad, mientras mantienen el cumplimiento de las pautas internas y externas. Demuestran un amplio compromiso con los impactos financieros, sociales y ambientales de los proyectos a los que prestan soporte.

- ▶ La administración abarca responsabilidades tanto internas como externas a la organización.
- ▶ La administración incluye:
 - Integridad,
 - Cuidado,
 - Confiabilidad, y
 - Cumplimiento.
- ▶ Una visión holística de la administración toma en cuenta la conciencia financiera, social, técnica y la sostenibilidad ambiental.

- ▶ **Integridad.** Los administradores se comportan honesta y éticamente en todos los compromisos y comunicaciones. Los administradores se adhieren a los más altos estándares y reflejan los valores, principios y comportamientos que se esperan de aquellos en su organización. Los administradores sirven como modelos a seguir, creando confianza al vivir y demostrar valores personales y organizacionales en su involucramiento, actividades de trabajo y decisiones. En el contexto de la dirección de proyectos, este deber a menudo requiere que los administradores desafíen a los miembros del equipo, compañeros y otros interesados a tener en cuenta sus palabras y acciones; y a ser empáticos, auto-reflexivos y abiertos a la retroalimentación.
- ▶ **Cuidado.** Los administradores son fiduciarios de los asuntos organizacionales a su cargo, y los supervisan diligentemente. Los proyectos de mayor desempeño cuentan con profesionales que supervisan diligentemente esos asuntos, más allá de los límites de las responsabilidades estrictamente definidas. Los administradores prestan mucha atención y ejercen el mismo nivel de cuidado sobre esos asuntos que lo harían con sus asuntos personales. El cuidado se relaciona con los asuntos de negocio internos de la organización. El cuidado del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales y la preocupación por las condiciones de las personas en todo el planeta deberían reflejarse en las políticas y principios organizacionales.

Los proyectos producen cambios que pueden tener consecuencias imprevistas o no deseadas. Los profesionales de proyectos deberían identificar, analizar y gestionar las desventajas potenciales de los resultados del proyecto para que los interesados estén conscientes e informados.

El cuidado incluye la creación de un entorno de trabajo transparente, canales de comunicación abiertos y oportunidades para que los interesados planteen preocupaciones sin penalización o miedo a represalias.

- ▶ **Confiabilidad.** Los administradores se representan con precisión a sí mismos, a sus roles, a su equipo del proyecto y a su autoridad, tanto dentro como fuera de la organización. Este comportamiento permite a las personas comprender el grado en que una persona puede comprometer recursos, tomar decisiones o aprobar algo. La confiabilidad también implica que las personas identifiquen proactivamente los conflictos entre sus intereses personales y los de su organización o clientes. Tales conflictos pueden socavar la confianza, dar lugar a comportamientos poco éticos o ilegales, crear confusión o contribuir a resultados menos que óptimos. Los administradores protegen los proyectos de tales violaciones de confianza.
- ▶ **Cumplimiento.** Los administradores cumplen con las leyes, normas, regulaciones y requisitos que están debidamente autorizados dentro o fuera de su organización. Sin embargo, los proyectos de alto desempeño buscan formas de integrar el cumplimiento más plenamente en la cultura del proyecto, creando una mayor alineación con pautas diversas y potencialmente conflictivas. Los administradores se esfuerzan por cumplir con las pautas destinadas a protegerlos a ellos, a su organización, a sus interesados y al público en general. En los casos en que los administradores enfrentan pautas o preguntas contradictorias con respecto a si las acciones o los planes se alinean o no con las pautas establecidas, los administradores buscan el asesoramiento y la dirección apropiados.

La administración requiere liderazgo con transparencia y confiabilidad. Los proyectos afectan la vida de las personas que los entregan, así como la de aquellos que se ven afectados por los entregables y resultados del proyecto. Los proyectos pueden tener efectos, tales como aliviar la congestión del tráfico, producir nuevos medicamentos o crear oportunidades para que las personas interactúen. Esos efectos pueden producir impactos y consecuencias negativas, tales como la reducción de las zonas verdes, los efectos secundarios de los medicamentos o la divulgación de información personal. Los equipos del proyecto y sus líderes organizacionales toman cuidadosamente en cuenta tales factores e impactos para que puedan tomar decisiones responsables equilibrando los objetivos organizacionales y los del proyecto con las necesidades y expectativas más significativas de los interesados globales.

Cada vez más, las organizaciones están adoptando una visión holística del negocio que considera el desempeño financiero, técnico, social y ambiental simultáneamente en lugar de secuencialmente. Dado que el mundo está interconectado ahora más que nunca, y posee recursos finitos y un entorno compartido, las decisiones de administración tienen ramificaciones más allá del proyecto.

2.- CREAR UN ENTORNO COLABORATIVO DEL EQUIPO DE PROYECTO

EQUIPO

Los equipos de proyecto están conformados por personas que poseen diversas habilidades, conocimiento y experiencia. Los equipos de proyecto que trabajan en colaboración pueden lograr un objetivo compartido de manera más efectiva y eficiente que las personas que trabajan por su cuenta.

- ▶ Los equipos de proyecto entregan los proyectos.
- ▶ Los equipos de proyecto trabajan dentro de las culturas y pautas organizacionales y profesionales, a menudo estableciendo su propia cultura "local".
- ▶ Un entorno colaborativo del equipo de proyecto facilita:
 - El alineamiento con otras culturas y pautas organizacionales,
 - El aprendizaje y desarrollo individual y de equipo, y
 - Las contribuciones óptimas para lograr los resultados deseados.

- **Acuerdos del equipo.** Los acuerdos del equipo representan un conjunto de parámetros de comportamiento y estándares de trabajo establecidos por el equipo del proyecto, y mantenidos a través del compromiso individual y del equipo del proyecto. El acuerdo del equipo debe crearse al comienzo de un proyecto, y evolucionará con el tiempo a medida que el equipo del proyecto continúe trabajando en conjunto e identifique las normas y comportamientos que son necesarios para continuar colaborando con éxito.
- **Estructuras organizacionales.** Los equipos del proyecto utilizan, adaptan e implementan estructuras que ayudan a coordinar el esfuerzo individual asociado con el trabajo del proyecto. Las estructuras organizacionales son cualquier arreglo o relación entre los elementos del trabajo del proyecto y los procesos organizacionales.

Estas estructuras se pueden basar en roles, funciones o autoridad. Pueden definirse como externas al proyecto, adaptadas para ajustarse al contexto del mismo o diseñadas recientemente para satisfacer una necesidad única del proyecto. Una figura de autoridad puede imponer formalmente una estructura, o los miembros del equipo del proyecto pueden contribuir a su diseño en forma alineada con las estructuras organizacionales.

Los ejemplos de estructuras organizacionales que pueden mejorar la colaboración incluyen, entre otros:

- ▷ Definiciones de roles y responsabilidades,
 - ▷ Asignación de empleados y proveedores a los equipos del proyecto,
 - ▷ Comités formales encargados de un objetivo específico, y
 - ▷ Reuniones permanentes que revisan regularmente un tema determinado.
- **Procesos.** Los equipos del proyecto definen procesos que permiten completar tareas y asignaciones de trabajo. Por ejemplo, los equipos del proyecto pueden acordar un proceso de descomposición utilizando una estructura de desglose del trabajo (EDT), una lista de trabajo pendiente o un tablero de tareas.

Los equipos del proyecto están influenciados por la cultura de las organizaciones que participan en el mismo, la naturaleza del proyecto y el entorno en el que operan. Estos equipos establecen sus propias culturas de equipo dentro de estas influencias, y pueden adaptar su estructura para lograr de mejor manera el objetivo del mismo.

Al fomentar entornos inclusivos y colaborativos, el conocimiento y la experiencia son intercambiados más libremente, lo que a su vez permite mejores resultados de los proyectos.

3.- INVOLUCRARSE EFICAZMENTE CON LOS INTERESADOS

INTERESADOS

Involucrar a los interesados de manera proactiva y en la medida necesaria para contribuir al éxito del proyecto y la satisfacción del cliente.

- ▶ Los interesados influyen en los proyectos, el desempeño y los resultados.
- ▶ Los equipos de proyecto sirven a otros interesados al interactuar con ellos.
- ▶ El involucramiento de los interesados promueve proactivamente la entrega de valor.

4.- ENFOCARSE EN EL VALOR

VALOR

Evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos de negocio y con los beneficios y el valor previstos.

- ▶ El valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto.
- ▶ El valor se puede obtener a lo largo del proyecto, al final del mismo o después de que el proyecto se haya completado.
- ▶ El valor y los beneficios que contribuyen al valor pueden definirse en términos cuantitativos y/o cualitativos.
- ▶ Un enfoque en los resultados permite que los equipos de proyecto apoyen los beneficios previstos que conduzcan a la creación de valor.
- ▶ Los equipos de proyecto evalúan el progreso y se adaptan para maximizar el valor esperado.

5.- RECONOCER, EVALUAR Y RESPONDER A LAS INTERACCIONES DEL SISTEMA

PENSAMIENTO SISTÉMICO

Reconocer, evaluar y responder a las circunstancias dinámicas dentro y alrededor del proyecto de una manera holística con el fin de afectar positivamente el desempeño del mismo.

- ▶ Un proyecto es un sistema de dominios de actividad, interdependientes e interactuantes.
- ▶ El pensamiento sistémico implica tener una visión holística de cómo las partes del proyecto interactúan entre sí y con sistemas externos.
- ▶ Los sistemas cambian constantemente, lo que requiere una atención constante a las condiciones internas y externas.
- ▶ Responder a las interacciones del sistema permite a los equipos de proyecto aprovechar los resultados positivos.

6.- DEMOSTRAR COMPORTAMIENTOS DE LIDERAZGO

LIDERAZGO

Demostrar y adaptar comportamientos de liderazgo para apoyar las necesidades individuales y de equipo.

- ▶ El liderazgo efectivo promueve el éxito del proyecto y contribuye a los resultados positivos del mismo.
- ▶ Cualquier miembro del equipo de proyecto puede demostrar comportamientos de liderazgo.
- ▶ El liderazgo es diferente a la autoridad.
- ▶ Los líderes efectivos adaptan su estilo a la situación.
- ▶ Los líderes efectivos reconocen las diferencias en motivación entre los miembros del equipo de proyecto.
- ▶ Los líderes demuestran el comportamiento deseado en áreas de honestidad, integridad y conducta ética.

El liderazgo no es exclusivo de ningún rol específico. Los proyectos de alto desempeño pueden contar con varias personas que exhiben habilidades de liderazgo efectivas, por ejemplo, el director del proyecto, los patrocinadores, los interesados, la alta dirección o incluso los miembros del equipo del proyecto. Cualquier persona que trabaje en un proyecto puede demostrar rasgos de liderazgo, estilos y habilidades eficaces para ayudar al equipo del proyecto a alcanzar y entregar los resultados requeridos.

Es importante señalar que pueden surgir más conflictos y confusiones cuando demasiados participantes intentan ejercer influencia en el proyecto en múltiples direcciones desalineadas. Sin embargo, los proyectos de mayor desempeño muestran una combinación paradójica de más personas influyentes, cada una aportando más habilidades de liderazgo de manera complementaria. Por ejemplo: si un patrocinador articula prioridades claras, entonces un líder técnico abre la discusión sobre opciones de entrega, donde los contribuyentes individuales afirman pros y contras hasta que el director del proyecto lleve la conversación a una estrategia de consenso. El liderazgo exitoso permite que alguien influya, motive, dirija y capacite a las personas bajo cualquier condición. También incorpora características derivadas de la cultura y las prácticas de una organización.

No se debe confundir el liderazgo con la *autoridad*, que es la posición de control otorgada a personas dentro de una organización para fomentar un funcionamiento general efectivo y eficiente. La autoridad es el derecho a ejercer el poder. Por lo general, la autoridad es delegada en una persona por medios formales, como un documento de acta de constitución o un título designado. Esta persona puede entonces tener una descripción del rol o posición que indique su autoridad. La autoridad denota responsabilidad por ciertas actividades, acciones de individuos o toma de decisiones en ciertas circunstancias. Si bien las personas pueden usar su autoridad para influir, motivar, dirigir a otros o actuar cuando otros no realizan o actúan como se les indica o se les solicita, esto no es lo mismo que el liderazgo. Por ejemplo, los ejecutivos de la organización pueden otorgar a alguien la autoridad para formar un equipo del proyecto con el fin de entregar un resultado. Sin embargo, la autoridad por sí sola es insuficiente. Se necesita liderazgo para motivar a un grupo hacia un objetivo común, influir en ellos para alinear sus intereses individuales en favor del esfuerzo colectivo y lograr el éxito como equipo del proyecto en lugar de como individuos.

El liderazgo efectivo se basa en o combina elementos de varios estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo documentados van desde los autocráticos, democráticos, “laissez-faire”, directivos, participativos, asertivos, solidarios y autocráticos hasta el basado en consenso. De todos estos, ningún estilo de liderazgo individual ha demostrado ser el enfoque universalmente mejor o el recomendado. En cambio, se demuestra un liderazgo efectivo cuando mejor se ajusta a una situación dada. Por ejemplo:

- ▶ En momentos de caos, la acción directiva genera más claridad e impulso que la resolución colaborativa de problemas.
- ▶ Para entornos con personal altamente competente e involucrado, la delegación empoderada recolecta más productividad que la coordinación centralizada.

7.- ADAPTAR EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO

ADAPTACIÓN

Diseñar el enfoque de desarrollo del proyecto basado en el contexto del proyecto, sus objetivos, los interesados, la gobernanza y el entorno utilizando un proceso de “apenas suficiente” para lograr el resultado deseado mientras se maximiza el valor, se gestiona el costo y se mejora la velocidad.

- ▶ Cada proyecto es único.
- ▶ El éxito del proyecto se basa en adaptarse al contexto único del mismo para determinar los métodos más apropiados para producir los resultados deseados.
- ▶ Adaptar el enfoque es iterativo, y por lo tanto es un proceso continuo a lo largo del proyecto.

8.- INCORPORAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS Y LOS ENTREGABLES

CALIDAD

Mantener un enfoque en la calidad que produzca entregables que cumplan con los objetivos del proyecto y se alineen con las necesidades, usos y requisitos de aceptación establecidos por los interesados relevantes.

- ▶ La calidad del proyecto implica satisfacer las expectativas de los interesados y cumplir con los requisitos del proyecto y del producto.
- ▶ La calidad se centra en cumplir con los criterios de aceptación para los entregables.
- ▶ La calidad del proyecto implica garantizar que los procesos del proyecto sean apropiados y lo más eficaces posible.

9.- NAVEGAR EN LA COMPLEJIDAD

COMPLEJIDAD

Evaluar y navegar continuamente por la complejidad del proyecto para que los enfoques y planes permitan al equipo de proyecto navegar con éxito por el ciclo de vida del mismo.

- ▶ La complejidad es el resultado del comportamiento humano, las interacciones de los sistemas, la incertidumbre y la ambigüedad.
- ▶ La complejidad puede producirse en cualquier momento durante el proyecto.
- ▶ La complejidad puede ser introducida por eventos o condiciones que afectan el valor, el alcance, las comunicaciones, los interesados, el riesgo y la innovación tecnológica.
- ▶ Los equipos de proyecto pueden mantenerse atentos a la identificación de elementos de complejidad y utilizar una variedad de métodos para reducir la cantidad o el impacto de la complejidad.

10.- OPTIMIZAR LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS

RIESGO

Evaluar continuamente la exposición al riesgo, tanto de oportunidades como de amenazas, con el fin de maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos para el proyecto y sus resultados.

- ▶ Los riesgos individuales y generales pueden afectar los proyectos.
- ▶ Los riesgos pueden ser positivos (oportunidades) o negativos (amenazas).
- ▶ Los riesgos son abordados continuamente a lo largo del proyecto.
- ▶ La actitud, el apetito y el umbral de riesgo de una organización influyen en cómo se aborda el mismo.
- ▶ Las respuestas a los riesgos deberían ser:
 - Adecuadas para la importancia del riesgo,
 - Eficientes en costo,
 - Realistas dentro del contexto del proyecto,
 - Acordadas por los interesados pertinentes, y
 - Propiedad de una persona responsable.

11.- ADOPTAR LA ADAPTABILIDAD Y LA RESILIENCIA

ADAPTABILIDAD Y RESILIENCIA

Construir adaptabilidad y resiliencia en los enfoques de la organización y del equipo de proyecto para ayudar al mismo a acomodar el cambio, recuperarse de los reveses y avanzar en el trabajo del proyecto.

- ▶ La adaptabilidad es la capacidad de responder a condiciones cambiantes.
- ▶ La resiliencia es la capacidad de absorber los impactos y de recuperarse rápidamente de un revés o fracaso.
- ▶ La atención a los resultados en lugar de a las salidas facilita la adaptabilidad.

Un proyecto rara vez funciona exactamente como se planeó inicialmente. Los proyectos están influenciados por factores internos y externos (nuevos requisitos, problemas, influencias de los interesados, entre otros factores) que existen en un sistema de interacciones. Algunos elementos dentro de un proyecto pueden fallar o estar por debajo de las expectativas, lo que requiere que el equipo del proyecto se reagrupe, reconsidere y replantee. En un proyecto de infraestructura, por ejemplo, una decisión judicial durante la ejecución del proyecto podría cambiar los diseños y planes. En un proyecto tecnológico, un modelo computarizado de la tecnología podría mostrar que los componentes funcionan correctamente en conjunto, pero la aplicación para el mundo real falla. En ambos casos, el equipo del proyecto necesitará abordar la situación para hacer avanzar el proyecto. La opinión de que los proyectos deben mantenerse firmes en los planes y compromisos asumidos durante las primeras etapas, incluso después de que surjan factores nuevos o imprevistos, no es beneficiosa para los interesados, incluidos los clientes y los usuarios finales, ya que limita el potencial de generar valor. Sin embargo, la adaptación debería hacerse con una visión holística, tal como un proceso de control de cambios adecuado, para evitar problemas tales como la corrupción o deslizamiento del alcance. En el entorno de un proyecto, las capacidades que apoyan la adaptabilidad y la resiliencia incluyen:

- ▶ Bucles cortos de retroalimentación para adaptar rápidamente;
- ▶ Aprendizaje y mejora continuos;
- ▶ Equipos del proyecto con amplios conjuntos de habilidades, junto con personas que tengan amplios conocimientos en cada área de habilidades requerida;
- ▶ Inspección periódica y adaptación del trabajo del proyecto para identificar oportunidades de mejora;
- ▶ Equipos del proyecto diversos para capturar una amplia gama de experiencias;
- ▶ Planificación abierta y transparente que involucre a los interesados internos y externos;
- ▶ Prototipos y experimentos a pequeña escala para ensayar ideas y probar nuevos enfoques;
- ▶ Capacidad para aprovechar nuevas formas de pensamiento y trabajo;
- ▶ Diseño del proceso que busca un balance entre la velocidad de trabajo y la estabilidad de los requisitos;
- ▶ Conversaciones organizacionales abiertas;
- ▶ Equipos del proyecto diversificados con amplios conjuntos de habilidades, culturas y experiencia, junto con expertos en la materia en cada área de habilidades requerida;
- ▶ Comprensión a partir del aprendizaje pasado de los mismos o similares esfuerzos;

12.- PERMITIR EL CAMBIO PARA LOGRAR EL ESTADO FUTURO PREVISTO

CAMBIO

Preparar a los afectados para la adopción y el mantenimiento de comportamientos y procesos nuevos y diferentes, requeridos para la transición del estado actual al estado futuro previsto creado por los resultados del proyecto.

- ▶ Un enfoque estructurado para el cambio ayuda a las personas, los grupos y la organización a pasar del estado actual a un estado futuro deseado.
- ▶ El cambio puede originarse a partir de influencias internas o fuentes externas.
- ▶ Facilitar el cambio puede ser un desafío, ya que no todos los interesados lo van a aceptar.
- ▶ Intentar demasiados cambios en un periodo corto puede provocar fatiga y/o resistencia al cambio.
- ▶ El involucramiento de los interesados y los enfoques motivacionales contribuyen a la adopción del cambio.



El cambio en una organización puede originarse de fuentes internas, tales como la necesidad de una nueva capacidad, o en respuesta a una brecha en el desempeño. El cambio también puede originarse en fuentes externas, tales como avances tecnológicos, cambios demográficos o presiones socioeconómicas. Cualquier tipo de cambio implica algún nivel de adaptabilidad o asimilación por parte del grupo que experimenta el cambio, así como los sectores industriales con las que interactúa el grupo.

El cambio puede ser implementado por los interesados y tener consecuencias para ellos. Habilitar el cambio de los interesados hace parte de facilitar que el proyecto proporcione el entregable requerido, así como el resultado previsto.

Habilitar el cambio en una organización puede resultar un desafío. Algunas personas pueden lucir como inherentemente resistentes al cambio o reacias al riesgo, y los entornos pueden exhibir una cultura conservadora, entre otras razones. La gestión de cambios efectiva utiliza una estrategia motivacional en lugar de una enérgica. El involucramiento y la comunicación bidireccional crean un ambiente en el que la adopción y asimilación del cambio pueden ocurrir o identificar algunas preocupaciones válidas de los usuarios resistentes, que pueden requerir ser abordadas.

Los miembros del equipo del proyecto y los directores del proyecto pueden trabajar con los interesados relevantes para abordar la resistencia, la fatiga y la absorción de cambios a fin de aumentar la probabilidad de que los clientes o receptores de los entregables del proyecto adopten o asimilen el cambio con éxito. Esto incluye comunicar tempranamente en el proyecto la visión y las metas asociadas con el cambio a fin de lograr la aceptación del mismo. Los beneficios del cambio y el impacto en los procesos de trabajo deberían comunicarse a todos los niveles organizacionales a lo largo del proyecto.

También es importante adaptar la velocidad del cambio al apetito de cambio, el costo y la capacidad de los interesados y el entorno para asimilar el cambio. Intentar generar demasiados cambios en un tiempo demasiado corto puede llevar a que se genere resistencia debido a la saturación del cambio. Incluso cuando los interesados acuerdan unánimemente que el cambio producirá más valor o mejorará los resultados, a menudo todavía tienen dificultades para trabajar a través de las acciones que proporcionarán mayores beneficios. Para fomentar la materialización de beneficios, el proyecto también puede incluir actividades para reforzar el cambio después de su implementación, con el fin de evitar que las personas regresen al estado inicial.

Reconocer y abordar las necesidades de los interesados para adoptar el cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto ayuda a integrar el cambio resultante en el trabajo del proyecto, lo que hace que sea más probable un resultado exitoso.



TRABAJO APLICADO N° 2 DE PRINCIPIOS (60%)

Este trabajo lo deben realizar los equipos ya formados, debiendo enviarlo al correo del relator hrgaete@uc.cl hasta el **viernes 28 de marzo de 2025 a las 18:00 hrs.** No se aceptan trabajos individuales.

El trabajo deberá venir escrito en Word, arial 12, tamaño carta, en 3 páginas. **ENVIAR EN PDF.**

Debe contener en la primera página (no incluida en las 3 páginas de desarrollo), los nombres de los integrantes y el número del equipo y nombre del proyecto.

Este trabajo tiene una nota ponderada del 60% de la nota final del módulo.

Pregunta de Desarrollo:

1.- Después de leer y comprender los 12 principios expuestos en clases, expliquen en qué situación de un proyecto real (que haya participado algún alumno del equipo o bien que lo haya observado desde fuera) no se aplicaron algunos de estos principios, causando grave daño al desarrollo de este o estos. También pueden hacer este análisis desde el punto de vista positivo, es decir, como impactó positivamente un principio al respetarse este en forma estricta. Deben aplicar 3 principios (solo entre los principios 1, 2, 6, 11 y 12) a un solo proyecto, a dos o tres, según sea el caso. Debe profundizar en el análisis sobre cuál fue su impacto.

No se debe mencionar la organización o proyecto real, pudiendo cambiar su nombre por uno ficticio. Se debe considerar la fecha (año) en que ocurrió, no debiendo ser de antes del año 2020.

2.- Redactar una pequeña conclusión general respecto a los 3 casos de análisis.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN
PROFESIONAL



www.educacionprofesional.ing.uc.cl

GRACIAS
