

SERVICIO CONSTRUCCIÓN

“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, CONEXIONADO,
TRASPASO DE CARGAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA
SALA ELECTRICA MEDIA TENSION N°2 ”

CODELCO DIVISIÓN VENTANA
SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS

03 FEB 2026

STN grupo
saesa

STN

grupo
saesa

Ubicación de las Obras

El Proyecto se localiza en la Región de Valparaíso, comuna de Puchuncaví, en las instalaciones de la División Ventanas de Codelco, ubicada en la localidad de Ventanas a 163 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santiago y a 39 kilómetros al norte de Viña del Mar.

Alcance del Servicio de Construcción

Incluye la normalización del SEP en nivel de 110/6,3 kV, específicamente orientado al reemplazo de la sala eléctrica de media tensión N°2 sobre OOC existentes y el equipamiento interior de esta, por una Nueva Sala Eléctrica modular (17000x7000x3980mm), resistencia al fuego F-120. Que suministra energía a la Refinería Electrolítica.

Adicionalmente, contempla la instalación de un trafo SSAA y la actualización e integración al sistema SCADA eléctrico, EDAC y SITR para dar cumplimiento al requerimiento normativo de la autoridad (CEN).

Las Obras de construcción consideran: (300 días plazo ejecución)

- Obras de construcción y Montaje de Nueva Sala Eléctrica MT N°2
- Montaje Trafo de SSAA
- Saneamiento de canalizaciones existentes
- Suministro y montaje de canalizaciones y sistemas de soporte nuevas instalaciones
- Suministro, tendido, confección de mufas y pruebas cables MT
- Suministro, tendido conexiónado cables de control y comunicaciones
- Habilitación y PES de nueva Sala Eléctrica MT N°2
- Suministro, montaje y conexiónado de equipos de comunicaciones de Sistema Scada
- Pruebas de Precomisionamiento y comisionamiento
- Traspaso de Carga
- Puesta en Servicio

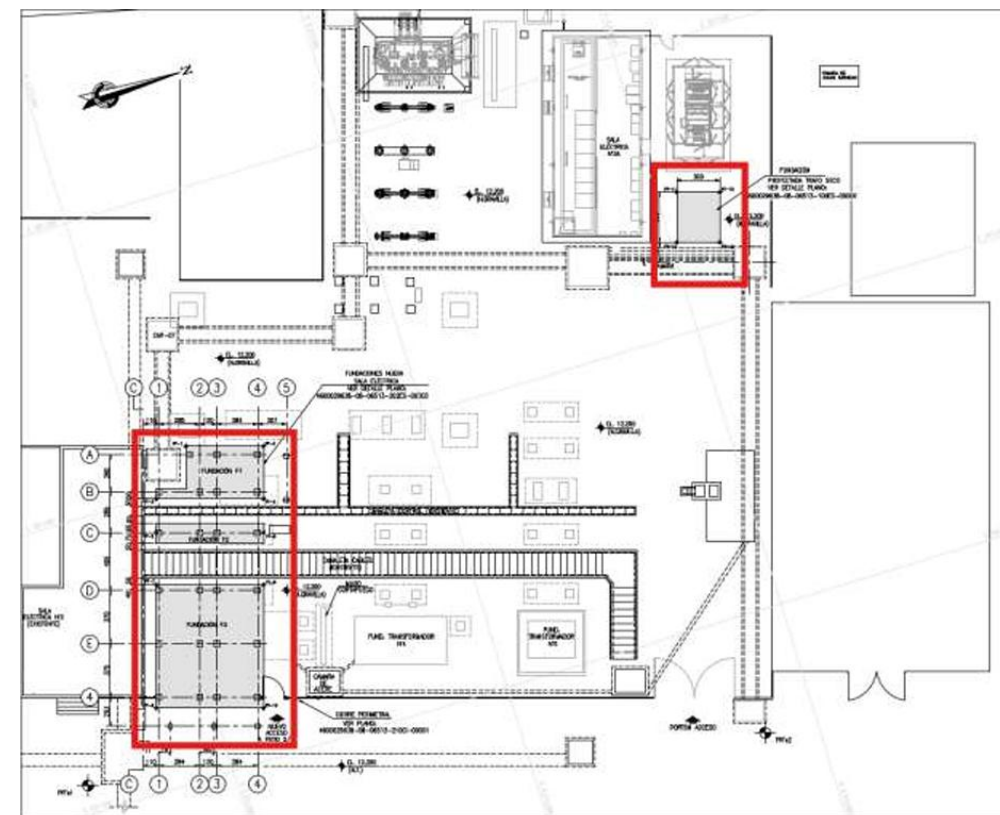



Figura 4-5 – Emplazamiento de Nueva Sala Eléctrica N°2





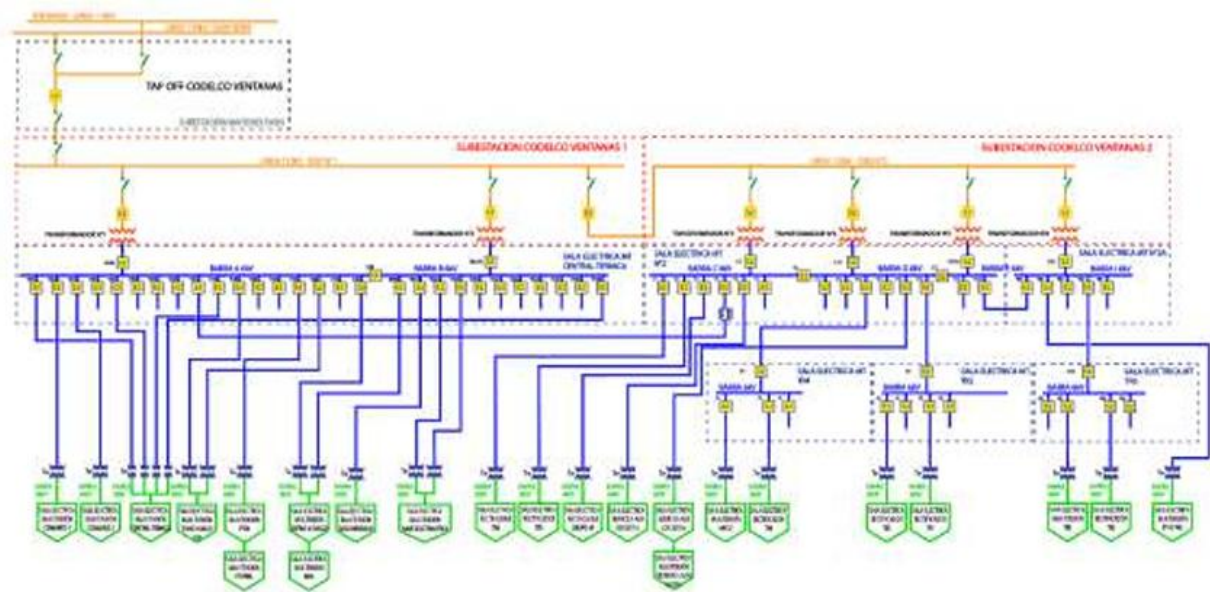


Figura 4-1 – Sistema Eléctrico DVEN

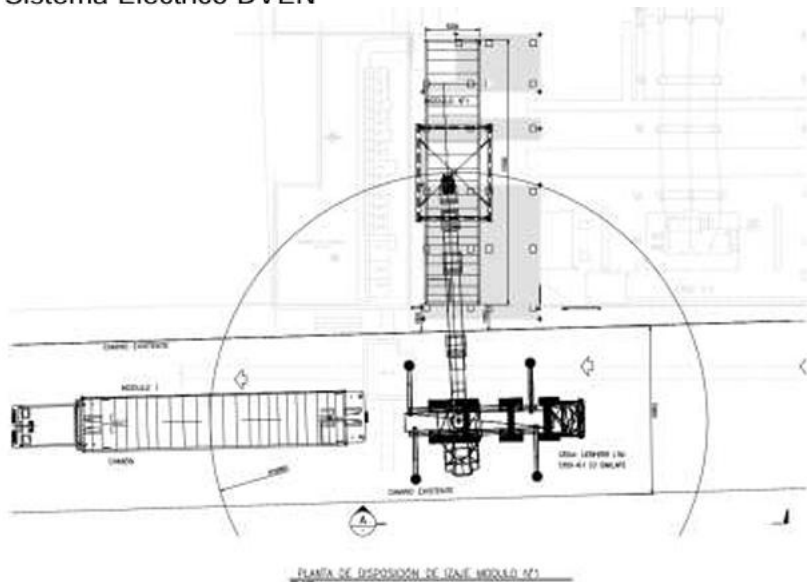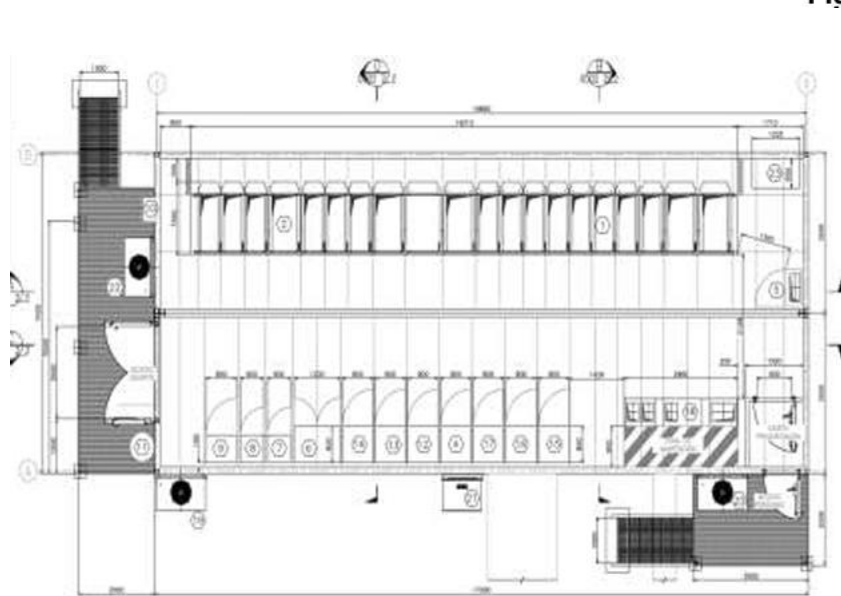

5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN

El siguiente itinerario comprende las actividades relevantes del Proceso de Licitación:

Hito	Fecha
Publicación del llamado a licitación	Jueves 29 de enero de 2026
Reunión explicativa y Visita terreno N°1 (obligatoria presencial)	Jueves 05 de febrero de 2026 a las 10:00 hrs Lugar de encuentro: Hall acceso peatonal DVEN; 2 personas máximo por empresa. Realizar al menos 48 hrs antes la autogestión de autopase en portal SUCAL (https://sucalcodelco.com/sign-in). Traer EPP indicados en numeral 7 de este documento IP
Ronda N°1 Consulta a las Bases de Licitación y al Contrato	Martes 10 de febrero de 2026 hasta las 15:00 hrs. Vía mensajería Ariba. Usar plantilla Codelco descargable desde Ariba
Entrega de Aclaraciones y Respuestas N°1 a los Participantes	Jueves 12 de febrero de 2026 Vía mensajería Ariba
Ronda N°2 Consulta a las Bases de Licitación y al Contrato	Martes 17 de febrero de 2026 hasta las 15.00 hrs. Vía mensajería Ariba. Usar plantilla Codelco descargable desde Ariba
Entrega de Aclaraciones y Respuestas N°2 a los Participantes	Jueves 19 de febrero de 2026 Vía mensajería Ariba
Presentación técnica preliminar por Videoconferencia (individual y obligatoria)	Miércoles 25 de marzo de 2026 (horarios por confirmar) Deberá confirmar participación final para ser invitado.
Recepción de Ofertas	Lunes 09 de marzo de 2026 a las 15.00 hrs.
Resultado estimado de Licitación (Adjudicación del Contrato)	Lunes 27 de abril de 2026.



Figura 4-12: Accesos Codelco Ventanas
