



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Informe Final – Talleres 1, 2, 3 y 4 (Módulo 3.2)

Proyecto de Implementación de IPTV para clientes de OptimaTel S.A.

Diplomado de Administración y Dirección de Proyectos

Versión N°82

Equipo 1

Jorge Bravo, Victoria Carrizo, Raimundo Gillet, Marcelo Jara, José Molina, Rodrigo Panozo

Santiago, 28 de Diciembre 2023

Índice

Breve descripción del caso de estudio	3
1. Taller 1: Elaborar el Árbol de Drivers de Valor (KDV) del Proyecto	4
2. Taller 2: Establecer Clases de Calidad de las Instalaciones/SoluciónWBS	5
2.1 Tabla de Categorías y Clases de Calidad	5
2.2 Tabla Resumen de Resultados	6
3. Taller 3: Elaborar Diagrama Causa – Efecto	7
4. Taller 4: Elaborar Reporte A3	8
Conclusión	9

Breve descripción del caso de estudio

OptimaTel es una empresa de telecomunicaciones que ofrece una variedad de servicios a sus clientes, incluyendo televisión por cable, internet y telefonía, con una sólida presencia en el mercado chileno. En este proyecto, OptimaTel busca implementar un servicio de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) con prestaciones adicionales a las que incluye el servicio que actualmente ofrece la compañía. El foco principal reside en diseñar e implementar dispositivos con nuevas funcionalidades y entregar este nuevo servicio a los clientes. Específicamente, se contempla incluir las funcionalidades Trickplay, VOD (Video On Demand), e integración con servicios OTT (Over-The-Top). A grandes rasgos, las fases técnicas del ciclo de vida del proyecto corresponden a Diseño, Desarrollo, Implementación y Traspaso a Operaciones.

En proyectos anteriores se ha observado recurrentemente una problemática que consiste en que, dentro de la estructura interna de OptimaTel, el equipo de desarrollo presenta retrasos en la resolución de Issues durante las validaciones de la etapa de desarrollo. En promedio estos retrasos tienen una duración de 15 días, lo cual no es aceptable ya que genera un cuello de botella para avanzar hacia las etapas siguientes del ciclo de vida del proyecto. La resolución de Issues es una fase crítica para cerrar la etapa de desarrollo del producto.

En este documento se presentan 4 Talleres correspondientes al módulo 3.2 del Diplomado de Administración de Proyectos versión 82 (Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile). En el primer Taller se generó un Árbol de Drivers de Valor (KVDs) del proyecto, donde se indicaron los objetivos del proyecto (en este caso se identificaron 2 además del objetivo principal), sus drivers de valor (en este caso se identificaron 5) y sus factores críticos de éxito (en este caso se identificaron 7) aplicando lo aprendido en clases. En el segundo Taller se aplicó el análisis CFQ (Classes of Facility Quality) para establecer la calidad del producto que se necesita para satisfacer los objetivos del proyecto. En el tercer Taller se desarrolló un diagrama de Causa – Efecto Ishikawa para el caso de estudio de los retrasos en la resolución de Issues por parte del equipo de desarrollo, considerando los 6 elementos del modelo. Finalmente, en el cuarto Taller se elaboró un reporte A3 para el mismo problema, incluyendo un contexto y situación actual de la problemática, un objetivo para abordarla, un análisis de sus causas, una propuesta de contramedidas con un plan de acción, y finalmente un seguimiento al plan propuesto.

1. Taller 1: Elaborar el Árbol de Drivers de Valor (KDV) del Proyecto

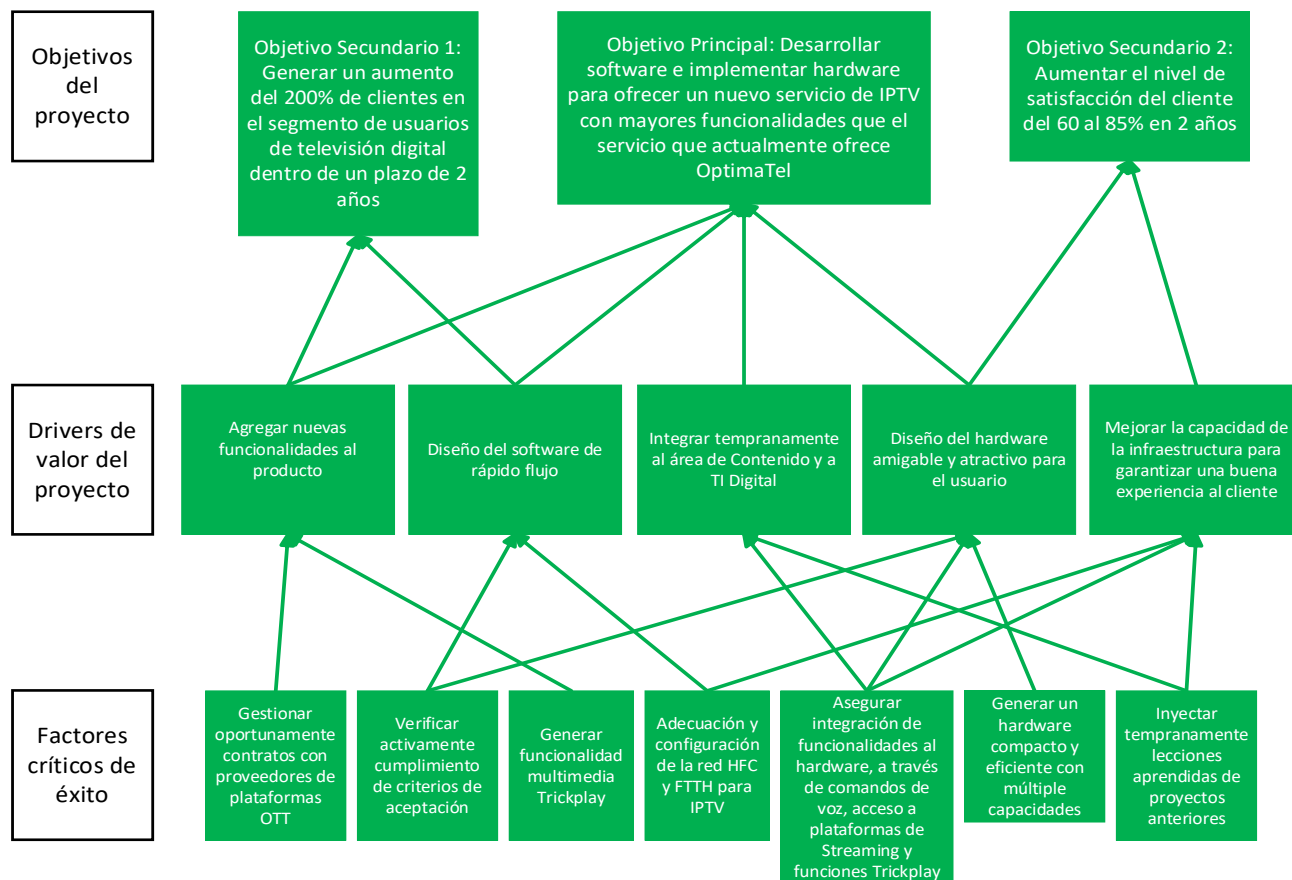


Figura 1. Árbol de Drivers de Valor (KDV) del Proyecto “Implementación de IPTV para clientes de OptimaTel S.A.”

2. Taller 2: Establecer Clases de Calidad de las Instalaciones/Solución

2.1. Tabla de Categorías y Clases de Calidad

Tabla 1. Tabla de Categorías y Clases de Calidad del Proyecto “Implementación de IPTV para clientes de OptimaTel S.A.”

Categoría	Definición	I	II	III	IV	V
Rendimiento	Evaluación de la velocidad y eficiencia del sistema, incluyendo la capacidad de procesamiento de hardware y la optimización del software para garantizar una transmisión de video fluida y una experiencia de usuario sin interrupciones.	Experiencia de usuario limitada, con interrupciones frecuentes en la transmisión y tiempos de carga prolongados.		Rendimiento aceptable, con ocasionales interrupciones leves en la transmisión y tiempos de carga ligeramente extendidos.		Transmisión de video sin interrupciones, carga rápida de contenidos y respuesta inmediata a las interacciones del usuario.
Confianza y disponibilidad	Medición de la fiabilidad y disponibilidad del sistema, incluyendo la capacidad de recuperación ante fallas y la disponibilidad del contenido en todo momento.	Confiabilidad limitada, con recuperación lenta ante fallos y períodos de no disponibilidad.		Confianza aceptable, con recuperación moderada ante fallos y disponibilidad ocasionalmente afectada.		Alta confiabilidad, con redundancia eficiente y recuperación rápida ante posibles fallas.
Seguridad	Evaluación de las medidas de seguridad implementadas para proteger el sistema contra amenazas como piratería, acceso no autorizado y protección de la privacidad de los usuarios.	Niveles limitados de seguridad, con vulnerabilidades evidentes y protección insuficiente de la privacidad.		Niveles aceptables de seguridad, con capacidad para resistir amenazas básicas y protección moderada de la privacidad.		Altos estándares de seguridad, resistencia ante ataques, acceso seguro y protección sólida de la privacidad del usuario.
Compatibilidad e interoperabilidad	Verificación de la capacidad del sistema para funcionar de manera armoniosa con diferentes dispositivos, estándares y protocolos, asegurando la interoperabilidad y la compatibilidad con diversos equipos y tecnologías.	Compatibilidad limitada, con dificultades para integrarse con varios dispositivos y estándares.		Compatibilidad aceptable, con limitaciones en algunos dispositivos y estándares menos comunes.		Amplia compatibilidad e interoperabilidad con una variedad de dispositivos, estándares y protocolos.
Facilidad de uso	Evaluación de la interfaz de usuario, la usabilidad del sistema y la accesibilidad, asegurando que los usuarios puedan navegar y utilizar el sistema de manera intuitiva y sin complicaciones.	Facilidad de uso limitada, con una interfaz que presenta desafíos en la navegación y comprensión.		Facilidad de uso aceptable, con una interfaz que puede ser mejorada para mayor intuición.		Interfaz de usuario intuitiva, fácil navegación y accesibilidad sobresaliente.
Mantenimiento y operaciones	Consideración de la facilidad con la que el sistema puede mantenerse y actualizarse, incluyendo la capacidad de aplicar parches de seguridad, actualizar contenido y realizar mejoras sin interrumpir el servicio.	El sistema presenta desafíos significativos en términos de mantenimiento, con interrupciones frecuentes durante actualizaciones y operaciones.		El sistema puede requerir cierto esfuerzo para el mantenimiento y las operaciones, con posibles interrupciones durante las actualizaciones y mejoras, pero en general es manejable.		El sistema se puede mantener y actualizar de manera eficiente, aplicando parches de seguridad, actualizando contenido y realizando mejoras sin interrumpir el servicio de manera rápida y efectiva.
Eficiencia energética	Evaluación de la eficiencia energética de los componentes de hardware y software, buscando minimizar el consumo de energía y promover prácticas sostenibles.	El sistema consume más energía de la necesaria, con oportunidades significativas para mejorar la eficiencia energética y seguir prácticas más sostenibles.		El sistema tiene un rendimiento aceptable en términos de eficiencia energética, pero hay margen para mejoras significativas para optimizar el consumo de energía.		El sistema demuestra un uso excepcionalmente eficiente de la energía en hardware y software, minimizando el consumo de energía y siguiendo prácticas sostenibles de manera destacada.

2.2. Tabla Resumen de Resultados

Tabla 2. Tabla Resumen de Resultados de la aplicación del análisis CFQ para el Proyecto “Implementación de IPTV para clientes de OptimaTel S.A.

Categorías y justificación	Sistema/Subsistema/Equipo/Solución		
	Software	Hardware	Contenido
Rendimiento	Clase III	Clase V	Clase IV
Justificación de la clase asignada	El software puede proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria con ocasionales interrupciones leves en la transmisión y tiempos de carga ligeramente extendidos, pero aceptable en general.	El hardware debe garantizar una transmisión de video sin interrupciones, carga rápida de contenidos y respuesta inmediata a las interacciones del usuario.	El contenido debe proporcionar una experiencia de usuario con transmisión sin interrupciones y carga rápida de contenidos, aunque pueden ocurrir interrupciones leves en circunstancias excepcionales.
Confianza y disponibilidad	Clase III	Clase V	Clase IV
Justificación de la clase asignada	El software puede mostrar una recuperación moderada ante fallos y la disponibilidad puede verse afectada ocasionalmente. En general, debe tener un nivel aceptable de confiabilidad.	El hardware debe demostrar alta confiabilidad con redundancia eficiente y recuperación rápida ante posibles fallas.	La confiabilidad del contenido debe ser alta, con una recuperación eficiente ante posibles fallos, aunque puede haber alguna afectación ocasional en la disponibilidad.
Seguridad	Clase V	Clase III	Clase V
Justificación de la clase asignada	El software debe presentar altos estándares de seguridad, resistiendo ataques y proporcionando un acceso seguro, con una protección sólida de la privacidad del usuario.	El hardware debe tener la capacidad de resistir amenazas básicas y proporcionar una protección moderada de la privacidad.	El contenido se debe caracterizar por la implementación de rigurosos estándares de seguridad, lo que le permitirá garantizar un acceso seguro. Debe proporcionar una protección sólida de la privacidad del usuario, asegurando un entorno confiable y seguro para la interacción con el contenido IPTV.
Compatibilidad e interoperabilidad	Clase V	Clase IV	Clase V
Justificación de la clase asignada	El software debe demostrar una amplia compatibilidad e interoperabilidad con una variedad de dispositivos, estándares y protocolos.	Aunque el hardware debe mostrar buena compatibilidad, pueden existir limitaciones en algunos dispositivos y estándares menos comunes, lo que coloca esta evaluación entre las clases III y V.	El contenido debe garantizar una amplia adaptación e interacción con diversos dispositivos, estándares y protocolos. Esta capacidad robusta asegura que el contenido pueda integrarse sin problemas en una variedad de entornos tecnológicos, proporcionando una experiencia uniforme y accesible para los usuarios.
Facilidad de uso	Clase V	Clase III	Clase IV
Justificación de la clase asignada	El software debe tener una interfaz intuitiva, facilitando la navegación y ofreciendo una accesibilidad sobresaliente.	El hardware debe ser fácil de usar, pero la interfaz puede mejorarse para una mayor intuición.	La interfaz del contenido se debe diseñar para ser intuitiva y con sobresaliente accesibilidad. Esto asegurará que los usuarios puedan disfrutar del contenido de manera fácil y sin complicaciones.
Mantenimiento y operaciones	Clase V	Clase III	Clase V
Justificación de la clase asignada	El software debe permitir realizar actualizaciones, parches de seguridad, y mejoras sin interrupciones significativas en el servicio de manera rápida y efectiva.	El hardware puede requerir cierto esfuerzo para el mantenimiento y las operaciones, con posibles interrupciones durante las actualizaciones y mejoras que en general son manejables.	Se debe prestar especial atención para permitir actualizaciones, parches de seguridad y mejoras sin interrupciones significativas en el servicio. El objetivo es mantener el contenido de manera eficiente y efectiva.
Eficiencia energética	Clase III	Clase V	Clase III
Justificación de la clase asignada	El software puede mostrar un rendimiento aceptable en eficiencia energética, ya que el producto debe tener un costo accesible.	Ya que la eficiencia energética del hardware afecta directamente al cliente, impactando en su consumo eléctrico doméstico, el hardware debe minimizar el consumo de energía y seguir prácticas sostenibles de manera destacada.	El Contenido se debe seleccionar buscando un bajo consumo de energía, aunque no se aspira alcanzar los más altos estándares de sostenibilidad energética, de manera que el producto no aumente significativamente su costo y así pueda ser accesible.

3. Taller 3: Elaborar Diagrama Causa – Efecto


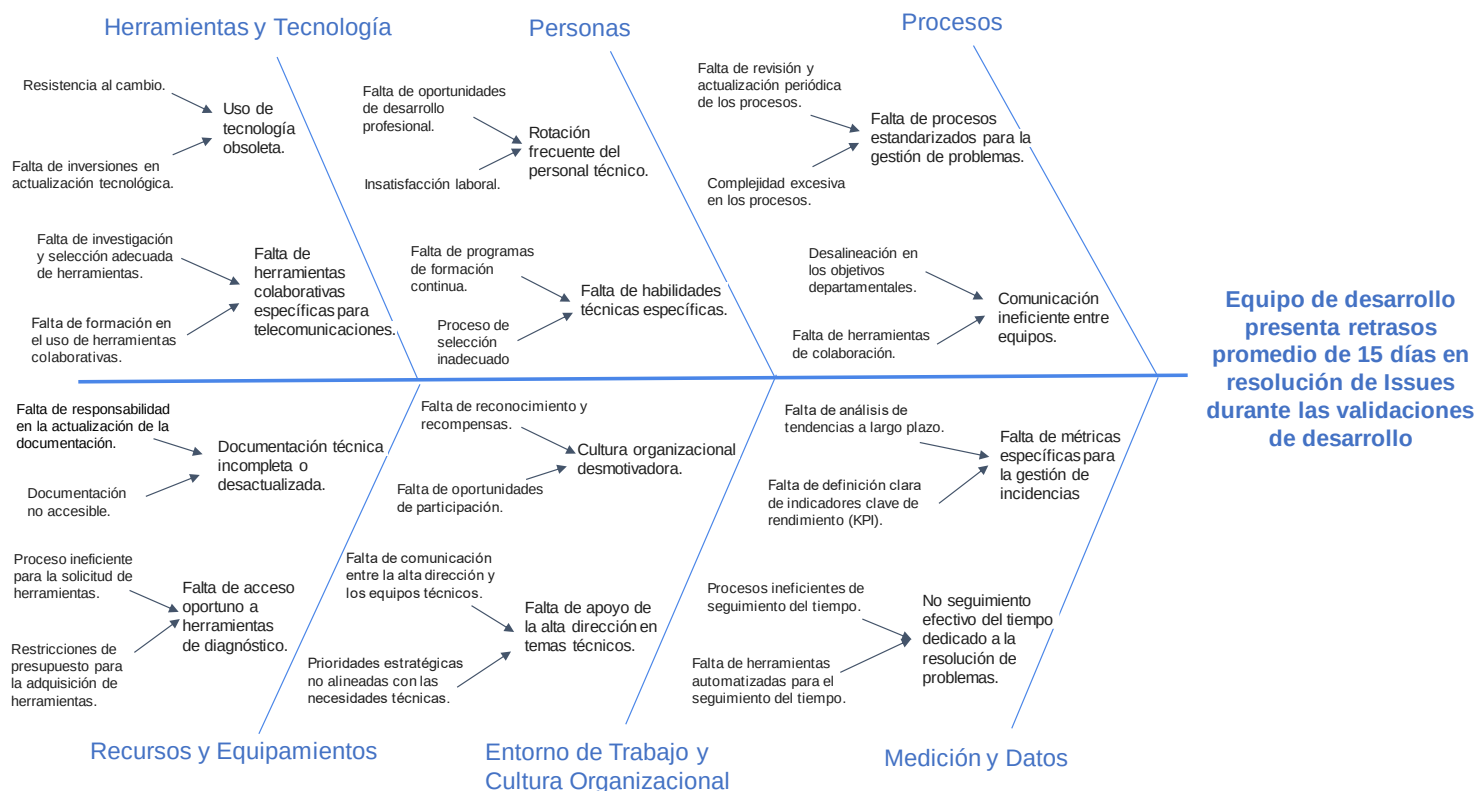


Figura 2. Diagrama Causa – Efecto o Ishikawa del Proyecto “Implementación de IPTV para clientes de OptimaTel S.A.”

Nombre del Proyecto	Proyecto de Implementación de IPTV para clientes de OptimaTel S.A.
---------------------	--

En la situación actual de la gestión de OptimaTel se observa que la resolución de Issues en la etapa de desarrollo presenta un tiempo de retraso promedio de 14,93 días, que aproximándolo corresponde a 15 días. El valor máximo de este tiempo corresponde a 21,2 días y el valor mínimo corresponde a 8,5 días. Los percentiles 75, 50, y 25 toman valores de 18,55, 15,1 y 11,3 días, respectivamente. Sería deseable que el tiempo de esta actividad tenga retrasos inferiores a 5 días, de manera que ni siquiera el mínimo observado históricamente con la gestión actual (8,5 días) es capaz de cumplir con lo requerido. Evidentemente este tiempo no está siendo optimizado, así que existe un gran potencial de mejorarlo en el actual proyecto haciendo mejoras en la gestión. En la siguiente figura se presenta un diagrama de caja y bigotes de la distribución del tiempo de retraso en la resolución de Issues durante la etapa de desarrollo en proyectos anteriores, el cual contiene la misma información que se acaba de describir.



Valor Inicial	15	Valor Objetivo	Menos de 5	Unidad	Días
---------------	----	----------------	------------	--------	------

Herramientas y Tecnología

- Resistencia al cambio.
- Falta de inversión en actualización tecnológica.
- Falta de investigación y selección adecuada de herramientas.
- Falta de formación en habilidades tecnológicas.
- Falta de responsabilidad en la actualización de la documentación.
- Documentación no actualizada.
- Procesos ineficientes para la validación de herramientas.
- Restricciones de la adquisición de herramientas.

Personas

- Falta de oportunidades de desarrollo profesional.
- Resistencia al cambio.
- Falta de programas de formación continua.
- Falta de habilidades técnicas específicas.
- Procesos de evaluación.
- Falta de reconocimiento y recompensas.
- Cultura organizacional disfuncional.
- Falta de oportunidades de participación.
- Falta de capacitación interna y externa.
- Falta de apoyo de alta dirección y los equipos técnicos.
- Falta de apoyo de alta dirección en temas técnicos.
- Problemas organizacionales en relación con las necesidades técnicas.

Procesos

- Falta de revisión y actualización de estándares de los procesos.
- Falta de procesos estandarizados para la gestión de problemas.
- Complejidad excesiva en los procesos.
- Desalineación en los objetivos de desarrollo.
- Falta de herramientas de colaboración.
- Falta de análisis de tendencias a largo plazo.
- Falta de métricas específicas para la gestión de incidencias.
- Procesos ineficientes de seguimiento de incidencias.
- No seguimiento de los tiempos de resolución de los problemas.
- Falta de herramientas automatizadas para el seguimiento del tiempo.

Equipo de desarrollo presenta retrasos promedio de 18 días en resolución de issues durante las validaciones de desarrollo


Recursos y Equipamientos

Entorno de Trabajo y Cultura Organizacional

Medicina y Datos

Dueño del A3:	Juan Carlos Valdebenito	Equipo de Proyecto
Sponsor:	Rodrigo Fuentes (director del portafolio)	N°1
Fecha actualización:	28-01-2024	

Id	CAUSAS RAÍZ/ Cuello de Botella	Contramedida propuesta
a	Falta de habilidades técnicas específicas	Implementar programas de formación y desarrollo técnico.
b	Rotación frecuente del personal técnico	Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento.
c	Falta de procesos estandarizados para la gestión de problemas	Establecer una revisión y actualización periódica de los procesos.
d	Comunicación ineficiente entre equipos	Implementar herramientas de colaboración efectivas.
e	Documentación técnica incompleta o desactualizada	Asignar responsabilidades claras para la actualización de la documentación.
f	Falta de acceso oportuno a herramientas de diagnóstico	Optimizar el proceso de solicitud y aprobación de herramientas.
g	Uso de tecnología obsoleta	Implementar programas de formación para la adopción de nuevas tecnologías.
h	Falta de herramientas colaborativas específicas para telecomunicaciones	Proporcionar formación en el uso de herramientas colaborativas.
i	Cultura organizacional desmotivadora	Implementar programas de reconocimiento y recompensas.
j	Falta de apoyo de la alta dirección en temas técnicos	Mejorar la comunicación entre la alta dirección y los equipos técnicos.
k	Falta de métricas específicas para la gestión de incidencias	Establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) claros y medibles.
	No seguimiento efectivo del tiempo dedicado a la resolución de problemas técnicos	Optimizar los procesos de seguimiento del tiempo.

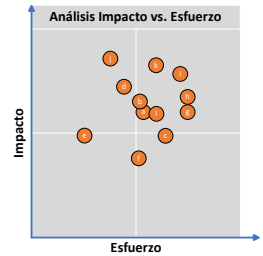

N	Acciones	Responsable	Fecha	Estado
1	Establecer programas de formación continua para asegurar que el personal adquiera y actualice las habilidades técnicas específicas necesarias.	Área Oficina Técnica	15-12-2023	Completado
2	Establecer programas que fomenten el desarrollo profesional y brinden oportunidades de crecimiento dentro de la organización.	Área de Training	12-01-2024	Completado
3	Implementar un programa de revisión y actualización regular de los procesos para asegurar su relevancia y eficacia continua.	Área de Calidad	12-02-2024	No iniciado
4	Evaluar y adoptar herramientas de colaboración específicas para mejorar la comunicación y la colaboración entre equipos.	Área de Comunicaciones	01-02-2024	No iniciado
5	Establecer roles y responsabilidades claras para garantizar que la documentación técnica se actualice de manera regular y oportuna.	PMO	04-12-2023	Completado
6	Optimizar el proceso de solicitud y aprobación de herramientas.	PMO	08-01-2024	Completado
7	Mejorar la eficiencia del proceso de solicitud y aprobación para garantizar un acceso rápido y oportuno a herramientas de diagnóstico.	Área de TI	01-02-2024	No iniciado
8	Generar programas de formación para ayudar al personal a adaptarse y adoptar nuevas tecnologías de manera efectiva.	Área Oficina Técnica	08-01-2024	Completado
9	Generar sesiones de formación para garantizar que los empleados estén familiarizados y sean competentes en el uso efectivo de las herramientas colaborativas.	Área de Training	01-02-2024	Completado
10	Establecer programas formales de reconocimiento y recompensas para fomentar una cultura más motivadora.	PMO	12-01-2024	En proceso
11	Facilitar reuniones periódicas y canales de comunicación directa entre la alta dirección y los equipos técnicos para mejorar la comprensión mutua.	Área de Comunicaciones	01-02-2024	No iniciado
12	Definir KPI específicos para la gestión de incidencias que proporcionen una visión clara del rendimiento y faciliten la toma de decisiones informada.	Área de Analítica	29-11-2023	Completado
13	Implementar sistemas automatizados y procesos eficientes para el seguimiento del tiempo dedicado a la resolución.	Área de Monitoreo	01-02-2024	No iniciado

Fecha	Acción	% Avance	Indicador Base	Logro	Acciones Correctivas
28-01-2024	1	100%	(Número de empleados que participan en programas de formación continua) / (Total de empleados) * 100	Si	Solicitar programas de capacitación con los Vendedores en las tecnologías ocupadas en el producto (buenas prácticas y actualizaciones)
28-01-2024	2	100%	(Número de actividades completadas) / (Total de actividades) * 100	100%	Crear un acuerdo empresarial con universidades para beneficios de cursos de capacitación y Diplomados Online y/o Presenciales
28-01-2024	3	70%	(Número de procesos revisados y actualizados / Total de procesos) * 100	100%	Desarrollar un programa de mejora continua de procesos.
28-01-2024	4	90%	(Número de herramientas adoptadas / Número total de herramientas evaluadas) * 100	Si	Definir el uso de una herramienta de colaboración digital.
28-01-2024	5	100%	(Número de documentos técnicos actualizados a tiempo) / (Total de documentos técnicos) * 100	Si	Actualizar y entregar el Plan de Comunicaciones para la reportería de resultados de pruebas.
28-01-2024	6	100%	(Suma de tiempos de procesamiento de todas las solicitudes) / (Número total de solicitudes)	Si	Solicitar capacitación con los Vendedores en el uso de las herramientas de diagnóstico
28-01-2024	7	87%	(Suma de tiempo de respuesta para todas las solicitudes) / Número total de solicitudes	100%	Presentar plan de mejora de procesos.
28-01-2024	8	100%	(Número de empleados que adoptan nuevas tecnologías) / (Total de empleados) * 100	100%	Desarrollar programas de entrenamiento técnico a los colaboradores del proceso de calidad y data analytics.
28-01-2024	9	90%	(Número de empleados competentes) / (Total de empleados capacitados) * 100	100%	Implementar plan de capacitación en el uso de la herramienta de colaboración definida.
28-01-2024	10	100%	(Número de empleados satisfechos) / (Total de empleados) * 100	Si	Crear e implementar un plan de recompensa en base a desempeño y cumplimiento de metas
28-01-2024	11	95%	(Número de participantes en reuniones) / (Total de miembros del equipo) * 100	Si	Actualizar y entregar el Plan de Comunicaciones entre diferentes niveles organizacionales.
28-01-2024	12	100%	(Suma de tiempos de resolución de todos los incidentes) / (Número total de incidentes)	100%	Implementar Plan de actualización y gestión de cambios, en documentación de PRD (Product Requirement Documents)
28-01-2024	13	95%	(Horas dedicadas al seguimiento del tiempo) / (Horas totales trabajadas) * 100	100%	Implementación de sistemas automatizados para el seguimiento del tiempo de resolución de issues.

Estándares Impactados

Impacta positivamente a las competencias técnicas del personal, el desarrollo profesional y de carrera, a la gestión eficiente de procesos, la comunicación y colaboración efectiva, la actualización regular de la documentación técnica, la gestión ágil de las solicitudes, la rápida adaptación a las nuevas tecnologías, la creación de una cultura organizacional motivadora, la comunicación efectiva entre la alta dirección y los equipos técnicos, la implementación de KPIs claros y medibles, y la optimización de procesos de seguimiento del tiempo. Estos estándares mejorados están contribuyendo significativamente a lograr el objetivo de reducir los tiempos de resolución de problemas.

Lecciones Aprendidas

Es esencial incorporar procesos de mejora continua para el aseguramiento del uso eficiente de las HH, recursos, así como también del cumplimiento de los objetivos de calidad de cada producto en el cual se trabaja.

Parte importante del cumplimiento de las actividades en los tiempos estandarizados es mantener a los colaboradores motivados y enfocados en el objetivo final, la buena comunicación entre las partes asegura que la visión sea la misma, aumentando el compromiso del equipo en general.

Conclusión

La elaboración del Árbol de Drivers de Valor (KDV) y la posterior definición de Clases de Calidad para las instalaciones y solución IPTV ha resultado en una herramienta valiosa para la evaluación y mejora de nuestro proyecto. En el Árbol de Drivers de Valor se observa que la mayoría de los drivers se relacionan a apuntar a una alta calidad en el software, hardware y contenido del producto. Luego, con el análisis CFQ, la identificación detallada de factores claves que influyen en la calidad, categorizados en clases, proporcionó una estructura clara para la toma de decisiones y la priorización de acciones correctivas. Se observó en los tres sistemas analizados, que varias de sus categorías deben tener alta calidad (valores entre III y V). Esto se relaciona con el objetivo del proyecto de generar un producto atractivo para el cliente, que mejore su satisfacción y propulse un aumento en las ventas.

La aplicación del Diagrama Causa – Efecto, junto con la elaboración de un Reporte A3, permitieron abordar de manera muy estructurada la problemática seleccionada. Luego de contextualizar el problema y analizar sus antecedentes se definió un objetivo claro, con características SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y Acotados en el Tiempo) y posteriormente se analizaron sus causas usando el diagrama Causa – Efecto. Fue muy útil la estructura del diagrama de Ishikawa dividida en sus 6 elementos, ya que el análisis se hizo muy directo y rápido. A grandes rasgos, las acciones a tomar para resolver el problema se pueden englobar en: i) generar programas de formación, ii) mejorar programas de revisión de procesos y documentación, iii) mejorar eficiencia de procesos, y iv) mejorar incentivos.

En resumen, la combinación de estas herramientas ha fortalecido significativamente nuestra capacidad para abordar desafíos específicos y mejorar la calidad y eficiencia en el proyecto IPTV. Al entender las causas fundamentales y aplicar acciones correctivas basadas en un análisis detallado, hemos establecido una base sólida para la mejora continua y el logro de nuestros objetivos en términos de reducción de retrasos en la resolución de problemas.
